



Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés Elnöke
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



Ált/246-1/2026.

Tárgyalja:

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal:

egyszerű többség

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Vármegyei Közgyűléshez -

**TOP_Plusz-3.3.3-23 kódszámú „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhíváshoz
kapcsolódó kiemelt eljárásrendű projektek előrehaladásáról**

A tájékoztató a Tankerületi Központok által megküldött anyagokat tartalmazza.

Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!

A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján a területi szereplő végrehajtja az Integrált Területi Programot (ITP) amelynek keretében a monitoring feladatainak ellátása céljából a kedvezményezettől a támogatott projektekkel összefüggésben adatszolgáltatást kérhet.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata az ITP végrehajtásának nyomon követése, valamint a kiemelt kedvezményezettek által megvalósított fejlesztések előrehaladásának áttekintése érdekében 2026.08.25. napján adatszolgáltatást kért a Kisvárdai, a Mátészalkai és a Nyíregyházi Tankerületi Központtól, mint a TOP_Plusz-3.3.3-23 kódszámú, „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhíváshoz kapcsolódó kiemelt kedvezményezettektől.

Az adatszolgáltatás kérés az alábbi tématerületekre terjedt ki:

- a projekt alapadatai (projektazonosító, projekt címe, támogatási összeg, finanszírozási forma, megvalósítási helyszín);
- a projekt szakmai előrehaladása;
- a fizikai és pénzügyi teljesítés állása;
- a projekt keretében vállalt indikátorok bemutatása, az azokhoz kapcsolódó vállalt célértékek, valamint az elért tényértékek ismertetése;
- a megvalósítás ütemezése, valamint az eredeti ütemtervtől való esetleges eltérések indokai;
- a projekt megvalósítását érintő lényeges változások, ideértve a finanszírozási forma módosulását is;
- a megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett vagy tervezett intézkedések ismertetése;
- a projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények, amennyiben ilyenek előfordultak;
- a projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja;
- a Vármegyei Közgyűlés tájékoztatása szempontjából lényeges egyéb információk.

A projektek megvalósításával összefüggő részletes szakmai tapasztalatokat, az eddig elért eredményeket a Tankerületi Központok által megküldött szakmai tájékoztatók mutatják be, melyek változatlan tartalommal kerültek a Vármegyei Közgyűlés részére készített tájékoztató mellékletébe.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban és a kapcsolódó mellékleteiben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2026. szeptember 17.





Mátészalkai Tankerületi Központ

**Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Önkormányzati Hivatal**

Nyíregyháza
Hősök tere 5.
4400

Tárgy: Tájékoztatás TOP_Plusz-33.3.-23 projektekről

Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatom, hogy a Mátészalkai Tankerületi Központ a lent felsorolt TOP_PLUSZ-3.3.3-23 kódszámú „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázatokban érintett.

s.sz.	Projekt megnevezése	Projekt címe	Támogatási összeg
1	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00001 azonosítószámú Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	4355 Nagyecsed Rózsas utca 1.	294.000.000
2	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00002 azonosítószámú Jármí-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	4337 Jármí Petőfi Sándor utca 18.	295.000.000
3	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00003 azonosítószámú Nyírkátai Általános Iskola felújítása	4333 Nyírkáta Hodászi u. 1-3. é	377.000.000
4	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00004 azonosítószámú Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	4700 Mátészalka Kölcsey tér 1.	61.000.000
5	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00005 azonosítószámú Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése-2. ütem	4361 Nyírbogát Hunyadi út 1.	159.000.000
6	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00006 azonosítószámú Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	4946 Tiszakóród Kossuth út 42.	63.500.000
7	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00007 azonosítószámú a Szatmárcsekesi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	4945 Szatmárcseke Kölcsey utca 11.	179.500.000

Székhely: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 10.

Telefon: +36-44-795-218

E-mail: mateszalka@kk.gov.hu

8	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00008 azonosítószámú Dr. Jósza Iatván Általános Iskola felújítása Kislétán	4325 Kisléta Kállói út 6-8.	114.000.000
9	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00009 azonosítószámú a A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	4900 Fehérgyarmat, Május 14 tér. 33	407.000.000

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00001 azonosítószámú Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00003 azonosítószámú Nyírkátai Általános Iskola felújítása, TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00004 azonosítószámú Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése és a TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00005 azonosítószámú Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése-2. ütem projektek esetében a megvalósítási folyamatok megkezdődtek, a tervezési szakasz folyamatban van.

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00007 azonosítószámú a Szatmárcsekesi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése projekt esetében a napokban újabb helyszíni bejárásra kerül sor a megvalósíthatóság érdekében.

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00009 azonosítószámú A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése projekt esetében a helyszíni bejárást követően szakember által megállapításra került, hogy statikai vizsgálatra lesz szükség, mely a következő hetekben valósul meg. Ennek függvényében folytatódik a projekt megvalósítása.

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00002 azonosítószámú Jármí-Papos-Ör Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00006 azonosítószámú Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00008 azonosítószámú Dr. Jósza Iatván Általános Iskola felújítása Kislétán projektek vonatkozásában a Támogatási Szerződésben vállalt tevékenységek megvalósításától a Mátészalkai Tankerületi Központ eláll, azaz a projektet a Támogatási Szerződés keretei között nem kívánja megvalósítani.

Mátészalka, 2026. szeptember 14.

Tisztelettel:

Vilmosné Horváth Ildikó
szakmai vezető, tankerületi igazgató h.



Székhely: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 10.

Telefon: +36-44-795-218

E-mail: mateszalka@kk.gov.hu

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00011

A projekt címe: A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 316 282 785 Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola; 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23-án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok: az épület elektromos hálózatának részleges felújítása, valamint az udvari futópálya és tenispálya felújítása

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbekzerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

2026. 02. hó- IKT eszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 02. 04.; részek: 18.

2026. 02. hó- sporteszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 01. 21.; részek: 4.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződéskötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

Az **IKT eszközök beszerzése** 18 részes közbeszerzési eljárás **szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés megtörtént.**

A **sporteszközök beszerzése** 4 részes közbeszerzési eljárásban a szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés folyamatban.

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértére vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT

A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft feletti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- Kommunikációs terv készült a pályázat benyújtásakor.
- nyomtatott vagy elektronikus tájékoztató készítése

Kelet- Magyarország napilap 2025.08.28.

12 Hirdetés

KELET-MAGYARORSZÁG
2025. augusztus 28., csütörtök

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SBI-2024-00011

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében, TOP_Plusz-3.3.3-23-SBI-2024-00011 azonosító számmal nyújtott be támogatási kérelmet „A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” címmel. A pályázat keretében összesen 316,28 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg az intézmény Tiszavasvári településén.

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése”
Pályázat címe: A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SBI-2024-00011
Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
A megítélt támogatás összege: 316 282 785 forint
A projekt tervezett befejezési időpontja: 2027. 08. 31.
A támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Az intézményben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szorgakodás csökkentéséhez, kulturális intézményi körökben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni. A projekt részeként megújul az épület elektromos hálózata, a futópálya, valamint a sportpályák. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközöket, tanúki asztalokat, színdísz színpadunkat és a 4-5-6. korcsoport részére.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.
További információ: nyiregyhaza@kk.gov.hu; +36 (42) 795 315

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SBI-2024-00012

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében, TOP_Plusz-3.3.3-23-SBI-2024-00012 azonosító számmal nyújtott be támogatási kérelmet „Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése” címmel. A pályázat keretében összesen 481,15 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg az intézmény Újfehértó településén.

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése”
Pályázat címe: Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SBI-2024-00012
Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
A megítélt támogatás összege: 481 152 577 forint
A projekt tervezett befejezési időpontja: 2027. 08. 31.
A támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Az intézményben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szorgakodás csökkentéséhez, kulturális intézményi körökben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni. A projekt részeként megújul az épület elektromos hálózata, a lámpatestek, az épület külső homlokzatú hőszigetelése és a külső nyílászárók. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközöket, tanúki asztalokat, színdísz színpadunkat és a 4-5-6. korcsoport részére.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.
További információ: nyiregyhaza@kk.gov.hu; +36 (42) 795 315

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése

<https://kk.gov.hu/a-tiszavasvari-kabay-janos-altalanos-iskola-infrastrukturalis-fejlesztese-top-plusz-3-3-23-sb1-2024-00011>

- térlet
- Intézményenk
- Közérdeklő adatok
- Szervezet
- Elérhetőség
- Projektok
- Tantervűlet: Tanácsok
- Tájékoztató a külföldről hazatérő tanulóknak
- Tájékoztató anyagok
- Vissza a főoldalra

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola
infrastrukturális fejlesztése TOP_PLUSZ-
3.3.3-23-SB1-2024-00011


A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_FUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastrukturára fejlesztése” című felhívás keretében, TOP_FUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011 azonosító számmal nyújtott be támogatást kérésre: A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” címmel. A pályázat keretében összesen 316,28 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg az intézmény Tiszavasvári telephelyén.

Pályázati konstrukció: TOP-PUJL-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztés”
 Pályázat címe: A Tiszavasvári Káthy János Általános Iskola
 Infrastruktúrájának fejlesztése
 Projekt azonosító száma: TOP-PUJL-3.3.3-23-SB1-2024-00011
 Kedvezményezett neve: Magyarországi Tankerületi Központ
 A megítélt támogatás összege: 316 282 786 Ft
 A projekt tervezett befejezési időpontja: 2027.06.31.
 A támogatás intenzitása: 100%
 Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap
 A projekt a Széchenyi Teret Plusz Program keretében valósul meg.

Az intézményben tervezett feladatokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkatevékeniség fejlesztéséhez, a nemek-átmeneti szívnálalnak emeléséhez, a tanulói szociális készségeinek, kulturális intézményi körében az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

A projekt részaként megújult az épület elektronikus hálózata, a felülvizsgálatot a sportpályák. A támogatás segítségével interaktív megjelenítők eszközök, tanulói asztalok, székek szerezhettünk be a 4-5-6 korcsoport részére.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam
finanszírozásával valósul meg

További információ: info@szek.gov.hu; +36 (42) 739-315

A projekt megvalósítási szakaszában

- **Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról**

A sajtónyilvános eseményünk előtt sajtóközleményt küldtünk ki a sajtó képviselőinek.



Mikita Eszter

FW: Nyíregyházi Tankerületi Központ, TOP PLUSZ 3.3.3. MEGHÍVÓ sajtó részére

Claudio Geronzi

 Előzetesendő. Készítés határideje: 2025. szeptember 12. Határidő: 2025. szeptember 12.

TOP PLUS3 3.3.3. megjelölés számla.docx.docx fájli	Belső irg. számlák társaságai.docx.docx fájli	Tiszadobok számlák társaságai.docx.docx fájli	Békéscsaba számlák társaságai.docx.docx fájli	Tiszadobok számlák társaságai.docx.docx fájli
Búji számlák társaságai.docx.docx fájli	Tiszacsemege számlák társaságai.docx.docx fájli	Ezerhárom Kálvária Rákóczi számlák társaságai.docx.docx fájli	Tiszadobok számlák társaságai.docx.docx fájli	Békéscsaba 4. számlák társaságai.docx.docx fájli
Tiszacsemege irg. számlák társaságai.docx.docx fájli	Kálvária Kálvária Rákóczi számlák társaságai.docx.docx fájli	Tiszadobok számlák társaságai.docx.docx fájli	Nyíregyháza számlák társaságai.docx.docx fájli	Újfehértó Városi Tisztviselői Társaságai.docx.docx fájli

From: Nyiregyházi TTK (DK) <nyiregyhaza@ttk.gov.hu>

Sent: Friday, September 12, 2025 12:30 PM

To: birad@miraneth.hu; kelecs@miraneth.hu; nepo@miraneth.hu; trifonov@miraneth.hu; zoltan@miraneth.hu; arczyv@miraneth.hu; nead@miraneth.hu; bonap@miraneth.hu; zabo@miraneth.hu; petr@miraneth.hu; monika@miraneth.hu

Cc: Pécsi Balta Ágnes <agnes.balta.pecsi@kk.gov.hu>

Subject: Nyíregyházi Tankerületi Központ TOP PLUSZ 3.3.3. MEGHÍVÓ sajtó részére

Tisztelt Szerkesztőség!

Mellékelten tisztelettel küldöm meghívónkat

Ötvenzettel:



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

Híregházi Tankerületi Központ
4400 Híregháza, Sóstói út 31/B. 8. épület
Telefon: +36 42 795 315
E-mail: nyiregyhaza@kk.gov.hu

- Sajtónyilvános esemény szervezése

2025. szeptember 24.

https://www.nyiregyhaza.hu/post/felujitasok-a-tankeruleti-kozpontnal-ket-es-fel-milliard-forintbol-korszerusodnek-az-iskolak-2025-09-25?fbclid=IwY2xjawNC_51leHRuA2FlbQlxMQBicmlkETBpb2pQaEhDaFNhMmtoT1M1AR5zD7-AzVdiwgfdVsuCGLK-U7Vh3eBZle-dWvW4yaGc8m9mEJ70aGLadbNIIQ_aem_iegBc0ibgdOSH91lgGy5w



Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka
Szept 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

– nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanárra, a tanítóra, a pedagógus egyéniségre fókuszál”

– nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése



- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozza magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:

	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00011	T420P01121	12 689 847	41 622 698	54 312 545

Kiadások:

	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	789 503	11 578 994	10 231 825	-375 539	22 224 783

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0
Az új vagy korszerűsített oktatási	Indikátor	2024.05.06.	717,0000				

létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	717
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	717
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	717
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	717
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	717
Az új vagy korszerűsített oktatási	Indikátor			2032.08.31.	0	0	717

létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	750	0	750
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	750
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	750
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	750
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	750
Az új vagy korszerűsített oktatási	Indikátor			2032.08.31.	0	0	750

Létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)							
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó

			energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.


A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

21 64 Q

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00012

A projekt címe: Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 481 152 577 Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézménye; 4244 Újfehértó, Kökény u. 22.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23-án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok: Homlokzati hőszigetelés külső nyílászáró cseréjével: A homlokzat salétromos, vizesedik, ezáltal folyamatosan leomlik. A jelenlegi leromlott állapot egy hosszabb folyamat eredménye, melynek során a lemálló és leomló vakolat egyre gyorsuló ütemben nő, ezért elengedhetetlen a további romlás megelőzése. Az ablakok és ajtók 28-35 évesek, már nem záródnak, a hő szabadon távozik. Az állagromlás olyan szintű, hogy egyes helyeken a tartermek felfűtése is gondot okoz.

Világítás korszerűsítése: A világítás korszerűsítése elengedhetetlen. A jelenlegi lámpatestek elavultak, égettek és törtek, gyakran meghibásodnak, korszerűtlenek, a fénycső kicserélésével sem működnek folyamatosan, felújításuk gazdaságtalan. Borongós idő esetén a lámpatestek fényei gyengék, rontják a tanulók látását. A folyosók, zártabb terek sem kapnak kellő megvilágítást, így balesetveszélyesek, ezért szükség van a lámpatestek teljes körű cseréjére. A cserével jelentős energiamegtakarítás is megvalósulhatna.

Villamoshálózat felújítása: Az elektromos hálózat a megnövekedett fogyasztói terhelést nem bírja. Az elosztóknál az elavult vezetékek melegednek, felújításra szorulnak. A kismegszakítók értéke nem megfelelő, cseréjük szükséges.

Iskolai bútorzat, IKT eszközök beszerzése.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbeszerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

2026. 02. hó- IKT eszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 02. 04.; részek: 18.

2026. 02. hó- sporteszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 01. 21.; részek: 4.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződéskötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

Az IKT eszközök beszerzése 18 részes közbeszerzési eljárás szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés megtörtént.

A sporteszközök beszerzése 4 részes közbeszerzési eljárásban a szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés folyamatban.

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértérek vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT

A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft feletti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- Kommunikációs terv készült a pályázat benyújtásakor.
- nyomtatott vagy elektronikus tájékoztató készítése

Kelet- Magyarország napilap 2025.08.28.

12 Hirdetés

KELET-MAGYARORSZÁG
2025. augusztus 28., csütörtök

**A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola
infrastrukturális fejlesztése**

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SBI-2024-00011

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében, TOP_Plusz-3.3.3-23-SBI-2024-00011 azonosító számmal nyújtott be támogatási kérelmet „A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése” címmel. A pályázat keretében összesen 316,28 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg az intézmény Tiszavasvári településén.

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése”
Pályázat címe: A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SBI-2024-00011
Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
A megítélt támogatás összege: 316 282 785 forint
A projekt tervezett befejezési időpontja: 2027. 08. 31.
A támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Az intézményben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturális intézményi környezetben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni. A projekt részeként megújul az épület elektromos hálózata, a futópálya, valamint a sportpálya. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközöket, tanulói asztalokat, székeket szerezhetünk be a 4-5-6. korcsoport részére.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

További információ: nyiregyhaza@kk.gov.hu; +36 (42) 795 315

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastruktúrális fejlesztése

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SBI-2024-00012

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében, TOP_Plusz-3.3.3-23-SBI-2024-00012 azonosító számmal nyújtott be támogatási kérelmet „Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastruktúrális fejlesztése” címmel. A pályázat keretében összesen 481,15 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg az intézmény Újfehértó településén.

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése”
Pályázat címe: Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének Infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SBI-2024-00012
Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
A megítélt támogatás összege: 481 152 577 forint
A projekt tervezett befejezési időpontja: 2027. 08. 31.
A támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Az intézményben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturális intézményi környezetben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni. A projekt részeként megújul az épület elektromos hálózata, a lámpatestek, az épület külső homlokzat hőszigetelése és a külső nyílászárók. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközöket, tanulói asztalokat, székeket, sporteszközöket szerezhetünk be.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

További információ: nyiregyhaza@kk.gov.hu; +36 (42) 795 315

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése

<https://kk.gov.hu/az-ujfehertoi-erkel-ferenc-altalanos-iskola-es-alapfoku-muveszeti-iskola-vasvari-pal-tagintezmenyenek-infrastrukturalis-fejlesztese-top-plusz-3-3-3-23-sb1-2024-00012>

**NYÍREGYHÁZI
TANKERÜLETI
KÖZPONT**

Nyíregyházi Tankerületi Központ | Projekt neve | Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastruktúrális fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SBI-2024-00012

Időszak
Készítési mód
Készítési mód
Szervezés
Előrejelzés
Projekt
Technikai Tervezés
Tervezési és költségvetési tervek
Tervezési tervek
Időszak
Időszak

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastruktúrális fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SBI-2024-00012

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében, TOP_Plusz-3.3.3-23-SBI-2024-00012 azonosító számmal nyújtott be támogatási kérelmet „Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastruktúrális fejlesztése” címmel. A pályázat keretében összesen 481,15 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg az intézmény Újfehértó településén.

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése”
Pályázat címe: Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének Infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SBI-2024-00012
Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
A megítélt támogatás összege: 481 152 577 forint
A projekt tervezett befejezési időpontja: 2027.08.31.
A támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Az intézményben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturális intézményi környezetben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni. A projekt részeként megújul az épület elektromos hálózata, a lámpatestek, az épület külső homlokzat hőszigetelése és a külső nyílászárók. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközöket, tanulói asztalokat, székeket, sporteszközöket szerezhetünk be.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

További információ: nyiregyhaza@kk.gov.hu; +36 (42) 795 315

Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka
Szept 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

– nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanár, a tanító, a pedagógus egyéniségre fókuszál"

– nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése



- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet

fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozzá magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00012	T420P01122	21 400 000	70 922 367	92 322 367

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	930 143	9 930 844	19 946 493	-435 610	30 371 870

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények	Indikátor	2024.05.06.	346,0000				

éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	346
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	346
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	346
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	346
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	346
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények	Indikátor			2032.08.31.	0	0	346

éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	782	0	782
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	782
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	782
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	782
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	782
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények	Indikátor			2032.08.31.	0	0	782

osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)							
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új

			épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00013

A projekt címe: A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 91 084 805 Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Nagykállói Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; 4320 Nagykálló, Nagybalkányi út 2.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23-án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok: A város szívében lévő, építészeti szempontból is különleges alaprajzzal rendelkező épületben a belső felújítás vált szükségessé, A tornacsarnok padlóburkolatának cseréje, a tornatermi öltözők felújítása mind hozzájárulnak az oktatás minőségének a javulásához.

- A tornaterem burkolata több évtizedes. A padló igen jelentősen kopott, szakadt és repedt, ez által nagyon balesetveszélyes. A tornaterem a mindennapos testnevelési órák során nagy igénybevételnek van kitéve. Szükségessé vált az előző burkolat bontása, a meglévő beton aljzat kiegyenlítése, sportpadló cseréje és vonalazása.
- Iskola tornatermi öltözői nagyon régiek, építésük óta felújításon nem estek át. A falon és az aljzaton lévő burkolat napi szintű javításra szorul, balesetveszélyes. A szennyvízrendszer folyamatosan eldugul. Az öltözők és a kapcsolódó helységek teljeskörű felújításra szorulnak.
- Iskolai bútorzat, IKT eszközök beszerzése.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbeszerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

2026. 02. hó- IKT eszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 02. 04.; részek: 18.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződéskötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

Az **IKT eszközök beszerzése** 18 részes közbeszerzési eljárás **szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés megtörtént.**

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértéρε vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT

A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft alatti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése

<https://kk.gov.hu/a-nagykalloi-altalanos-iskola-es-alapfoku-muveszeti-iskola-infrastrukturalis-fejlesztese-top-plusz-3-3-3-23-sb1-2024-00013>

NYÍREGYHÁZI TANKERÜLETI KÖZPONT

Nyíregyházi Tankerületi Központ | Projektek | Projekt hírek | A Nagykálói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola...

Hírek
Infóanyagok
Kérdések és válaszok
Szervezet
Elérhetőség
Projektek
Tankerületi Tanácsok
Tájékoztató a közfoglalkoztatásról
Tájékoztató a közfoglalkoztatásról
Tájékoztató a közfoglalkoztatásról
Vélemények

A Nagykálói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013

2023. szeptember 25. 9:30

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében, TOP_Plus-3.3.3-23-SB1-2024-00013 azonosító számmal nyújtott be támogatási kérelmet „A Nagykálói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése” címmel. A pályázat keretében összesen 481,15 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg az intézmény Nagykaló telephelyén.



→ Európai Regionális Fejlesztési Alap



→ Európai Szociális Alap



→ Integritás

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése”
Pályázat címe: A Nagykálói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013
Közzétett dokumentum neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
A megítélt támogatás összege: 91 084 805 forint
A projekt tervezett befejezési időpontja: 2026.08.31.
A támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Az intézményben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturális intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

A projekt részeként megújul a tornacsarnok padlóburkolata, megújulnak a tornatermi öltözők felújítása. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközöket, tanulói asztalokat, székeket szerezhetünk be.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

További információ: nyiragyhaza@ktk.gov.hu; +36 (42) 795-315



A projekt megvalósítási szakaszában

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

A sajtónyilvános eseményünk előtt sajtóközleményt küldtünk ki a sajtó képviselőinek.

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadada és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

– nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanárra, a tanítóra, a pedagógus egyéniségre fókuszál"

– nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítsa helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése



- Az intézmény működő honlapján és a közmédiában való megjelenítés
https://nai.edu.hu/2025/09/18/a-nagykalloi-altalanos-iskola-es-alapfoku-muveszeti-iskola-infrastrukturalis-fejlesztese-top_plusz-3-3-3-23-sb1-2024-00013/

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255202659738031&set=a.535649058360065>



- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozza magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00013	T420P01123	3 691 500	87 393 305	91 084 805

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	6 507	4 139 994	7 567 632	-364 617	11 349 516

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	2024.05.06.	325,0000				
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	325
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	325
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	325
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	325
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	325

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	325
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	400	0	400
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	400
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	400
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	400
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	400

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	400
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély

			köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.


A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00014

A projekt címe: A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 112 554 853 Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; 4450 Tiszalök, Kossuth u. 43.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23-án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok:

- meglévő padlóburkolatok elbontása
- új padlóburkolatok elhelyezése
- tantermekben belső glettelések festések végzése
- meglévő szabványpala elbontása
- új cserép elhelyezése az épület déli szárnyán
- Iskolai bútorzat, IKT eszközök, sporteszközök beszerzése.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbeszerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

2026. 02. hó- IKT eszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 02. 04.; részek: 18.

2026. 02. hó- sporteszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 01. 21.; részek: 4.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződéskötésre csupán 4 rész esetében** kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.

Az **IKT eszközök beszerzése** 18 részes közbeszerzési eljárás **szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés megtörtént.**

A **sporteszközök beszerzése** 4 részes közbeszerzési eljárásban a szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés folyamatban.

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértékre vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT


A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft alatti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése
- <https://www.facebook.com/tklaiami>
-
- <https://kossuth-tlok.edu.hu/P%C3%A1ly%3%A1zatok.html#sec-241c>
-

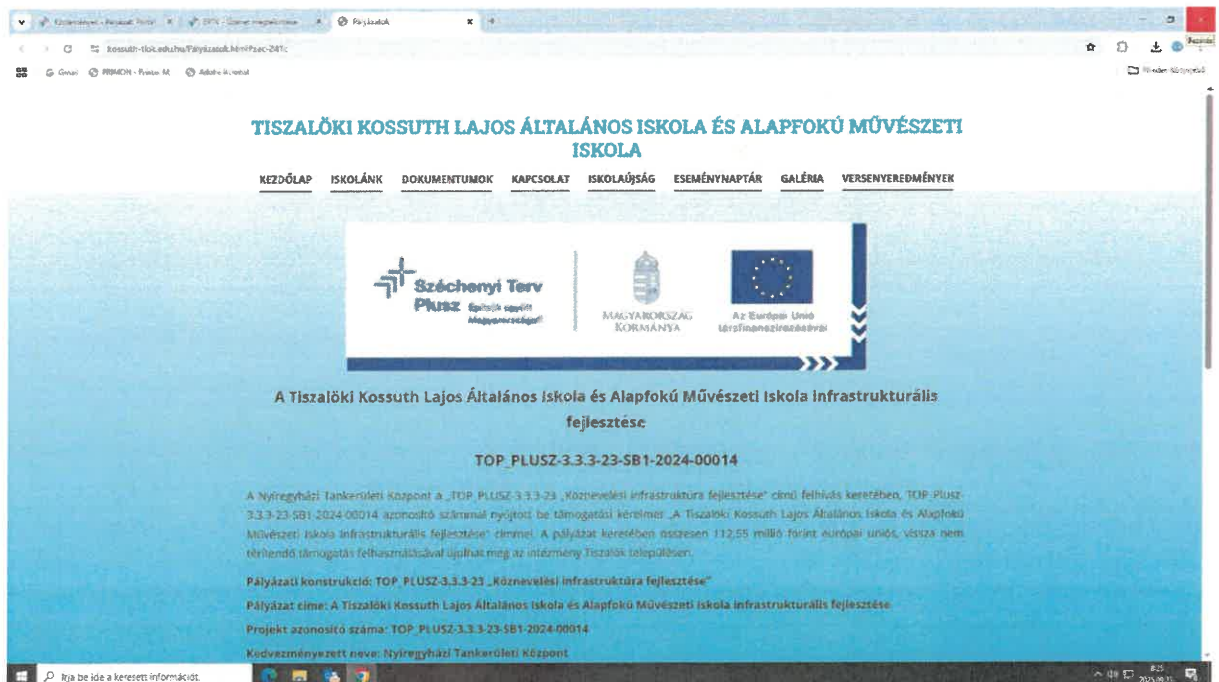

A projekt megvalósítási szakaszában

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

A sajtónyilvános eseményünk előtt sajtóközleményt küldtünk ki a sajtó képviselőinek.



- Sajtónyilvános esemény szervezése

2025. szeptember 24.

https://www.nyiregyhaza.hu/post/felujitasok-a-tankerületi-kozpontnal-ket-es-fel-milliard-forintbol-korszerusodnek-az-iskolak-2025-09-25?fbclid=IwY2xjawNC_51eHRuA2FlbQlxMQBicmlkETBpb2pQaEhDaFNhMmtoT1M1AR5zD7-AzVdiwgfDVsuCGLK-U7Vh3eBZle-dWwW4yaGc8m9mEJ70aGLadbnIIQ_aem_jegBc0ibgdOSH91ligGy5w



Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka

Szeptember 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökényi, tiszadobi, tiszadada és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

– nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanárra, a tanítóra, a pedagógus egyéniségre fókuszál"

– nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése



- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozza magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00014	T420P01124	4 307 820	108 247 033	112 554 853

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	6 507	5 759 244	7 582 370	-359 156	12 988 965

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	2024.05.06.	425,0000				
Az új vagy korszerűsített	Indikátor			2027.08.31.	0	0	425

oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	425
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	425
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	425
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	425
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	425
Az új vagy korszerűsített	Indikátor			2027.08.31.	680	0	680

oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	680
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	680
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	680
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	680
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	680
Korszerűsített köznevelési	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1

intézmények száma							
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.

Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetéről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)
----------------------	---	-------------	---

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026. szeptember 3.



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00015

A projekt címe: A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 438 689 125Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; 4233 Balkány, Kossuth út 5.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23-án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok: A fűtési rendszer részleges felújítása, hőszivattyú, napelem telepítése, világításkorszerűsítés. Iskola bútorzat, Ikt eszközök, sporteszközök beszerzése.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/ költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbeszerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

2026. 02. hó- IKT eszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 02. 04.; részek: 18.

2026. 02. hó- sporteszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 01. 21.; részek: 4.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződéskötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

Az **IKT eszközök beszerzése** 18 részes közbeszerzési eljárás **szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés megtörtént.**

A **sporteszközök beszerzése** 4 részes közbeszerzési eljárásban a szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés folyamatban.

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértére vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT

A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft feletti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- Kommunikációs terv készült a pályázat benyújtásakor.
- nyomtatott vagy elektronikus tájékoztató készítése

Kelet- Magyarország napilap 2025.08.28.

A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében, TOP_Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00015 azonosító számmal nyújtott be támogatási kérelmet „A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése” címmel. A pályázat keretében összesen 438,69 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg az intézmény Balkány településen.

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése”

Pályázat címe: A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015

Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ

A megítélt támogatás összege: 438 689 125 forint

A projekt tervezett befejezési időpontja: 2027. 08. 31.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Az intézményben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

A projekt részeként megújul az intézmény fűtési rendszere: a tornacsarnokban korszerű hőszivattyús rendszerrel biztosíthatjuk a megfelelő hőmérsékletet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközöket, tanulói asztalokat, székeket, sporteszközöket szerezhettek be.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

További információ: nyiregyhaza@kk.gov.hu; +36 (42) 795-315

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése
- <https://szabolcsvez-balkany.edu.hu/dokumentumok/topplusz.PNG>



- Sajtónyilvános esemény szervezése

2025. szeptember 24.

https://www.nyiregyhaza.hu/post/felujitasok-a-tankerületi-központnál-két-es-fél-milliárd-forintból-korszerűsödnek-az-iskolák-2025-09-25?fbclid=IwY2xjawNC_51leHRuA2FlbQlxMQBicmlkETBpb2pQaEhDaFNhMmtoT1M1AR5zD7-AzVdiwgFDVsuCGLK-U7Vh3eBZle-dWvW4yaGc8m9mEJ70aGLadbNlIQ_aem_jegBc0ibgdOSH91ligGy5w



Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka
Szept 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

- nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanárra, a tanítóra, a pedagógus egyéniségre fókuszál”

– nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése





- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozza magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00015	T420P01125	20 330 000	70 922 367	91 252 367

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	557 103	6 140 244	19 946 493	-435 610	26 208 230

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	2024.05.06.	459				
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	459
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	459

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	459
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	459
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	459
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	459
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	1090	0	1090
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	1090

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	1090
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	1090
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	1090
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	1090
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1

Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

SAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00016

A projekt címe: A Tiszadadai Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 101 972 222Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Tiszadadai Holló László Általános Iskola; 4450 Tiszalök, Kossuth u. 43.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23-án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok:

Az intézmény tornatermének tetőszerkezete a folyamatos karbantartások ellenére sérült, több helyen beázik, a sportpadló elhasználódott, szakadt, így nem szolgálja a tanulók egészséges mozgásának fejlesztését. Szükségessé vált az épület további akadálymentesítése, a tornatermi ajtók cseréje, valamint az öltözők előtti földszinti előtér burkolatának cseréje, iskola bútorzat, interaktív kijelző beszerzése.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/ költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbeszerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

2026. 02. hó- IKT eszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 02. 04.; részek: 18.

2026. 02. hó- sporteszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 01. 21.; részek: 4.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződéskötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

Az **IKT eszközök beszerzése** 18 részes közbeszerzési eljárás **szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés megtörtént.**

A **sporteszközök beszerzése** 4 részes közbeszerzési eljárásban a szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés folyamatban.

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértére vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT

A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.


NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft alatti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése


<https://kk.gov.hu/a-tizadadai-hollo-laszlo-altalános-iskola-es-alapfoku-muveszeti-iskola-infrastrukturális-fejlesztése-top-plusz-3-3-3-23-sb1-2024-00016>

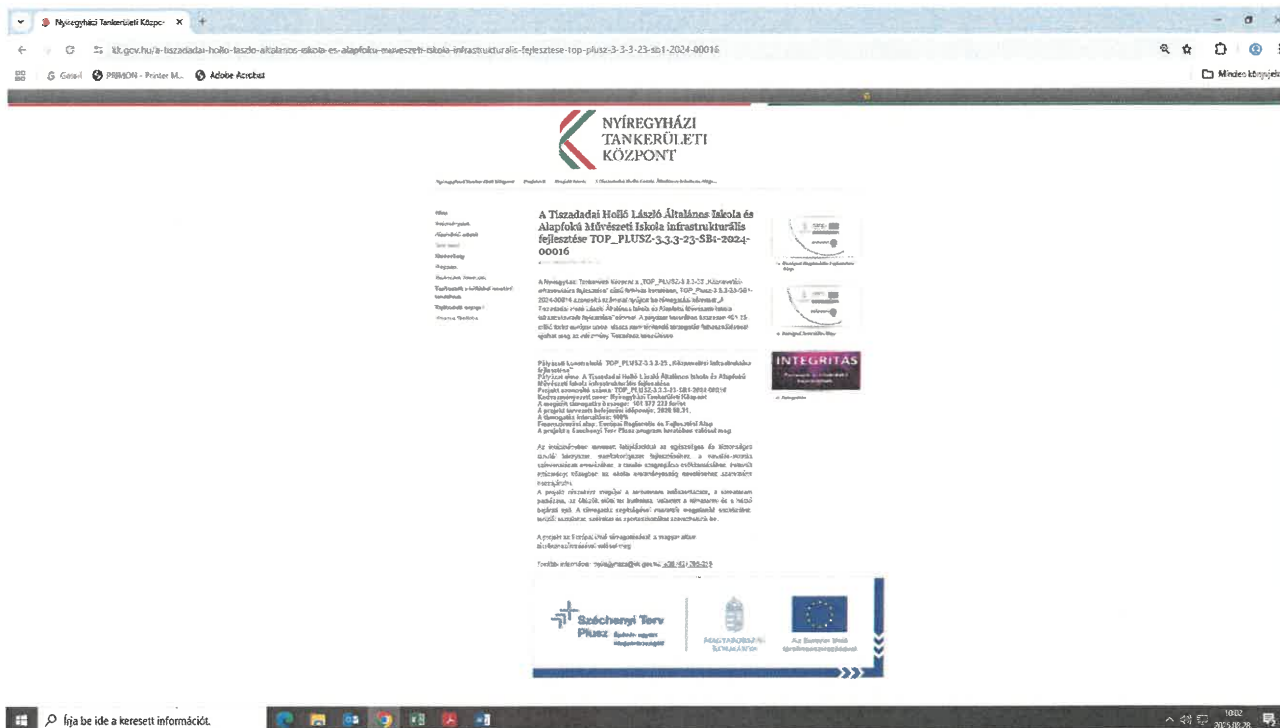

A projekt megvalósítási szakaszában

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

A sajtónyilvános eseményünk előtt sajtóközleményt küldtünk ki a sajtó képviselőinek.



Tisztek Szerkesztőség!

Melékben tisztelettel küldöm meghívónkat.

Ödvözléssel:



- Sajtónyilvános esemény szervezése

2025. szeptember 24.

https://www.nyiregyhaza.hu/post/felujitasok-a-tankeruleti-kozpontnal-ket-es-fel-milliard-forintbol-korszerusodnek-az-isolak-2025-09-25?fbclid=IwY2xjawNC_51leHRuA2FlbQlxMQBicmlkETBpb2pQaEhDaFNhMmtoT1M1AR5zD7-AzVdiwgfDVsuCGLK-U7Vh3eBZle-dWvW4yaGc8m9mEJ70aGLadbNlIQ_aem_jegBc0ibgdOSH91ligGv5w



Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka
Szept 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

– nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanárra, a tanítóra, a pedagógus egyéniségre fókuszál"



– nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése

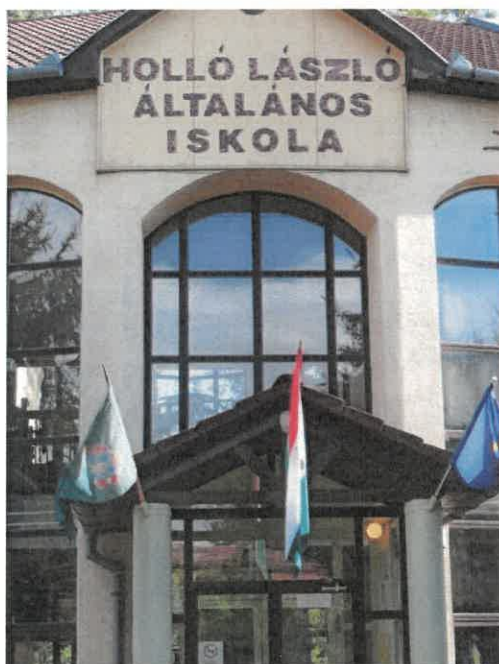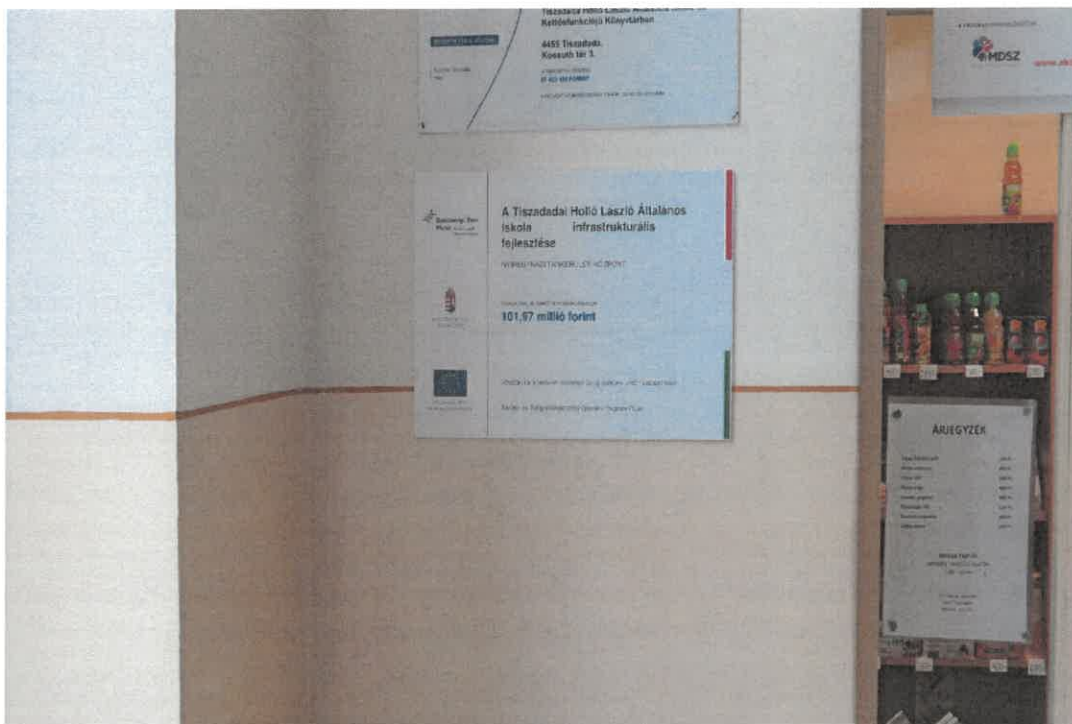

- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozza magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00016	T420P01126	4 064 513	97 907 709	101 972 222

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	6 507	20 110 244	7 582 370	-359 156	27 339 965

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0
Az új vagy korszerűsített oktatási	Indikátor	2024.05.06.	171,0000				

létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	171
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	171
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	171
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	171
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	171
Az új vagy korszerűsített oktatási	Indikátor			2032.08.31.	0	0	171

létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	332	0	332
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	332
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	332
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	332
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	332
Az új vagy korszerűsített oktatási	Indikátor			2032.08.31.	0	0	332

létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)							
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó

			energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.



[Handwritten signature]

Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

[Handwritten marks]

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00017

A projekt címe: A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 97 798 100 Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola; 4532 Nyírtura, Arany János u. 19.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23-án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok:

A település egyetlen általános iskolájában a tantermi padlóburkolatok cseréje, a festési munkálatok, a folyosó oldalfali lambéria felújítása, az udvar térkövezése, valamint az eszközbeszerzés mind hozzájárulnak az oktatás minőségének a javulásához.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbekészítés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

2026. 02. hó- IKT eszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 02. 04.; részek: 18.


Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződéskötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

Az IKT eszközök beszerzése 18 részes közbeszerzési eljárás szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés megtörtént.

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértékre vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

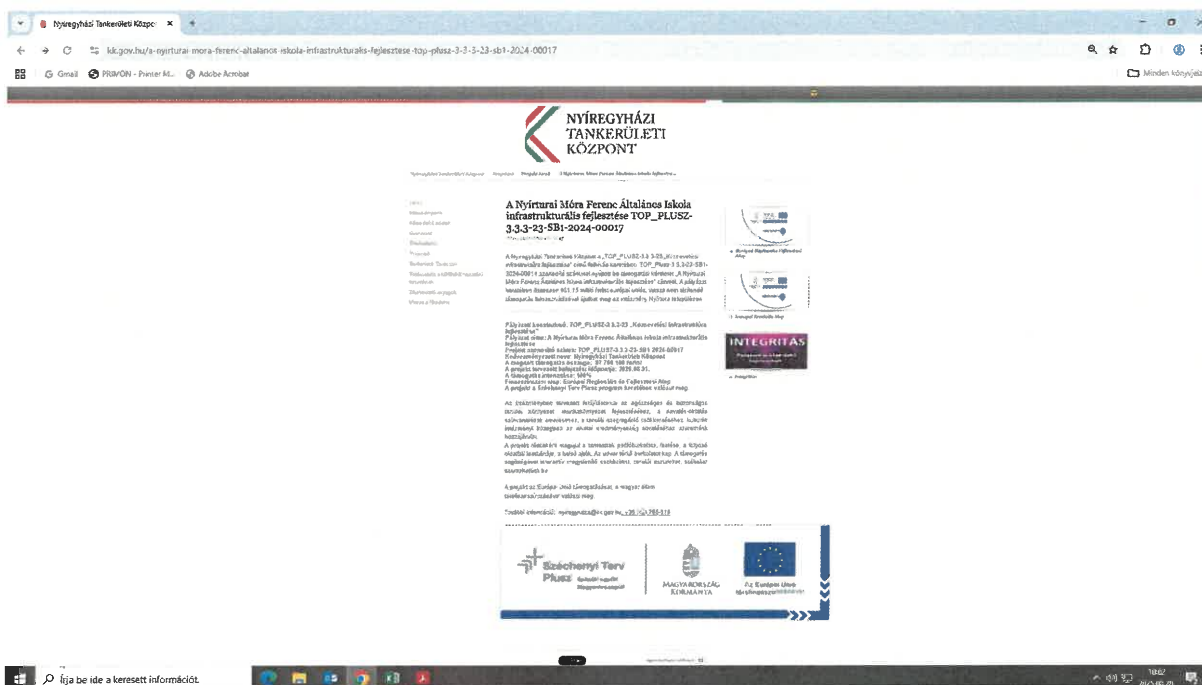

2025. szept 18. ·

TOP PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-3.3.3-23
„Köznevelési infrastruktúra fejlesztése”
Pályázat címe: A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola
Infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-
2024-00017

Az intézményben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

6



P 2025.09 12:12:36

Mikita Eszter

FW: Nyíregyházi Tankerületi Központ, TOP PLUSZ 3.3.3. MEGHÍVÓ sajtó részére

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

Előzetes: Kérdés határideje: 2025. szeptember 12. Határidő: 2025. szeptember 12.

TOP FLUZ 3.3.3. maghrib saġo.docx docx filj	Baħrija saġo.docx docx filj	Tassewif saġo.docx docx filj	Baħrija saġo.docx docx filj	Tassewif saġo.docx docx filj
Bif saġo.docx docx filj	Tassewif saġo.docx docx filj	Eżerċiżi Kalkolati Kalkolati saġo.docx docx filj	Tassewif saġo.docx docx filj	Bif saġo.docx docx filj
 Tassewif saġo.docx docx filj	 Kalkolati Kalkolati saġo.docx docx filj	 Tassewif saġo.docx docx filj	 Tassewif saġo.docx docx filj	 Tassewif saġo.docx docx filj

From: Nyiregyházi TIKK (KK) <nyiregyhazi@tkk.roy.hu>

Sent: Friday, September 12, 2025 12:30 PM

To: harold@nyireghazty.hu; kelel@nyireghazty.hu; nagio@nyireghazty.hu; trifonov@nyireghazty.hu; 7-polya@gmail.com; harcrystea@nyireghazty.hu; paivhortan97@gmail.com; honiso@nyireghazty.hu; szabo.gabriella@nyireghazty.hu; peter.sipelt@kaler.hu; monika.bednarik@kaler.hu; kelel@kaler.hu; szabo@medicwords.hu; info@sunshinefm.hu; marianne.spoos@sunshinefm.hu; varrozs@mti.hu; belazsa@mti.hu; seiko@bestfmnyireghazty.hu; nyireghazty@radio1.hu

kari@kari.hu; liado@mednexus.hu; info@sunshinefm.hu; marianne.yoon@sunshinefm.hu; yaron@mi.hu; kriszsa@mi.hu; zolt@bestfmradiohaza.hu; mirac'haza@radio1.hu

Subject: Nyíregyházi Tankerületi Központ TOP PLUSZ 3.3.3. MEGHÍVÓ sajtó részére

Tisztelt Szerkesztőség!

Melléklethen tisztelettel küldöm meghívónkat

Üdvözléssel:



- Sajtónyilvános esemény szervezése

2025. szeptember 24.

https://www.nyiregyhaza.hu/post/felujitasok-a-tankerületi-kozpontnal-ket-es-fel-milliard-forintbol-korszerusodnek-az-iskolak-2025-09-25?fbclid=IwY2xjawNC_51leHRuA2FlbQlxMQBicmlkETBpb2pQaEhDaFNhMmtoT1M1AR5zD7-AzVdiwgfDVsuCGLK-U7Vh3eBZle-dWvW4yaGc8m9mEJ70aGLadbNlIQ_aem_jegBc0ibgdOSH91ligGy5w



Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka
Szept 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

- nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanárra, a tanítóra, a pedagógus egyéniségre fókuszál”

– nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése





- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozza magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00017	T420P01127	4 053 160	93 744 940	97 798 100

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	6 507	8 863 442	6 699 218	-353 695	15 215 472

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	2024.05.06.	165,0000				
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	165
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	Indikátor			2028.08.31.	0	0	165

(kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	165
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	165
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	165
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	165
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	200	0	200
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	Indikátor			2028.08.31.	0	0	200

(kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	200
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	200
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	200
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	200
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1

intézmények száma							
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00018

A projekt címe: A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 85 875 684 Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola; 4231 Bököny, József Attila u. 2.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23-án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok:

Az iskola nem rendelkezik megfelelően kialakított, szilárd burkolatú sportudvarral. A jelenlegi füves pálya a talaj minősége miatt kiszárad, esős időben csúszásveszélyes, valamint a folyamatosan képződő vakondtúrások miatt göröngyössé, balesetveszélyessé válik. A szilárd burkolatú sportudvar kialakítása a mindennapos sportfoglalkozások, tornaórák, edzések, sportköri foglalkozások zavartalan megtartásához a kültéri sportolás lehetőségének a biztosítása érdekében nélkülözhetetlen az intézmény tanulói számára, hozzájárulva az oktatás minőségének a javulásához. Az épületben a közlekedő területek padlóburkolatának cseréje, közlekedő területek festése, tornatermi öltözők padlóburkolatának cseréje falak festése, belső ajtók cseréje és az iskolai eszközbeszerzés hozzájárul az intézmény fejlesztéséhez.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/ költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbeszerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

2026. 02. hó- IKT eszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 02. 04.; részek: 18.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződéskötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

Az IKT eszközök beszerzése 18 részes közbeszerzési eljárás szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés megtörtént.

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértékre vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT


A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft alatti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése
<https://kk.gov.hu/a-bokonyi-barota-mihaly-altalanos-iskola-infrastrukturális-fejlesztése-top-plusz-3-3-3-23-sb1-2024-00018>

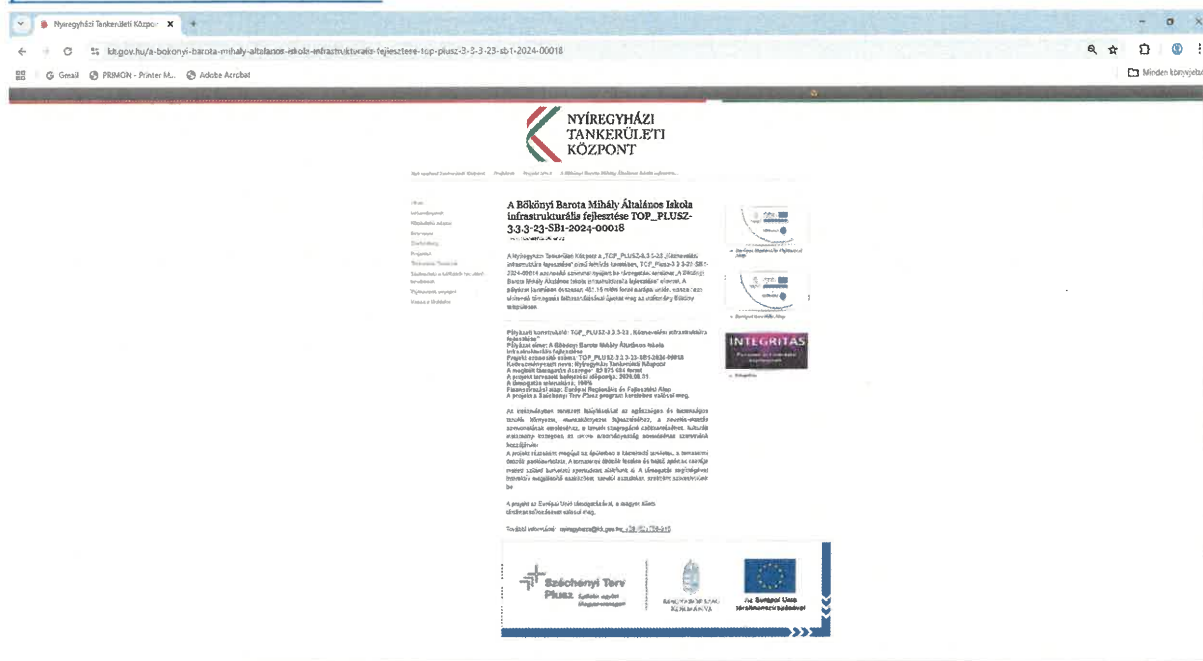

Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett intézmény honlapján 2025.09.19-én:

<https://barotaiskola.webnode.hu/hirek/>

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018 tájékoztató



- **Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról**

A sajtónyilvános eseményünk előtt sajtóközleményt küldtünk ki a sajtó képviselőinek.



TOP PLUS2 3.3.3. megvald sajd.docx daca faji	Bolkny sajtdoklertemny.docx daca faji	Tzadeds sajtdoklertemny.docx daca faji	Bolkny sajtdoklertemny.docx daca faji	Tzadeds sajtdoklertemny.docx daca faji
Bug sajtdoklertemny.docx daca faji	Tzadeds sajtdoklertemny.docx daca faji	Emselbt Kiklynd Ralazaz sajtdoklertemny.docx daca faji	Tzadeds sajtdoklertemny.docx daca faji	Bolkny 4 sajtdoklertemny.docx daca faji
Tzadeds sajtdoklertemny.docx daca faji	Kalya Kalyasaz sajtdoklertemny.docx daca faji	Tzadeds sajtdoklertemny.docx daca faji	Nyvta sajtdoklertemny.docx daca faji	Gfahds Nvnyd Tzadeds sajtdoklertemny.docx daca faji

[illegible]

Tisztelt Szerkesztőség!

Melékletben társlelettel küldöm meghívónkat.

Üdvözléttel:



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

Nyíregyházi Tankerületi Központ
4400 Nyíregyháza, Szentfi út 31/B. B. épület
Telefon: +36 42 795 315
E-mail: nyirevhsz@kk.gov.hu

- Sajtónyilvános esemény szervezése

2025. szeptember 24.

https://www.nyiregyhaza.hu/post/felujitasok-a-tankeruleti-kozpontnal-ket-es-fel-milliard-forintbol-korszerusodnek-az-iskolak-2025-09-25?fbclid=IwY2xjawNC_51eHrRuA2FblQlxMQBicmlkETBpb2pQaEhDaFNhMmtoT1M1AR5zD7-AzVdiwgfDVsuCGLK-U7Vh3eBZLe-dWwV4yaGc8m9mEj70aGLadbNlIQ_aem_jegBc0ibgdOSH91ligGy5w



Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka
Szept 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszerelték okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

– nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországá"

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanárra, a tanítóra, a pedagógus egyéniségre fókuszál"

– nyilatkozta a képviselő.


A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése



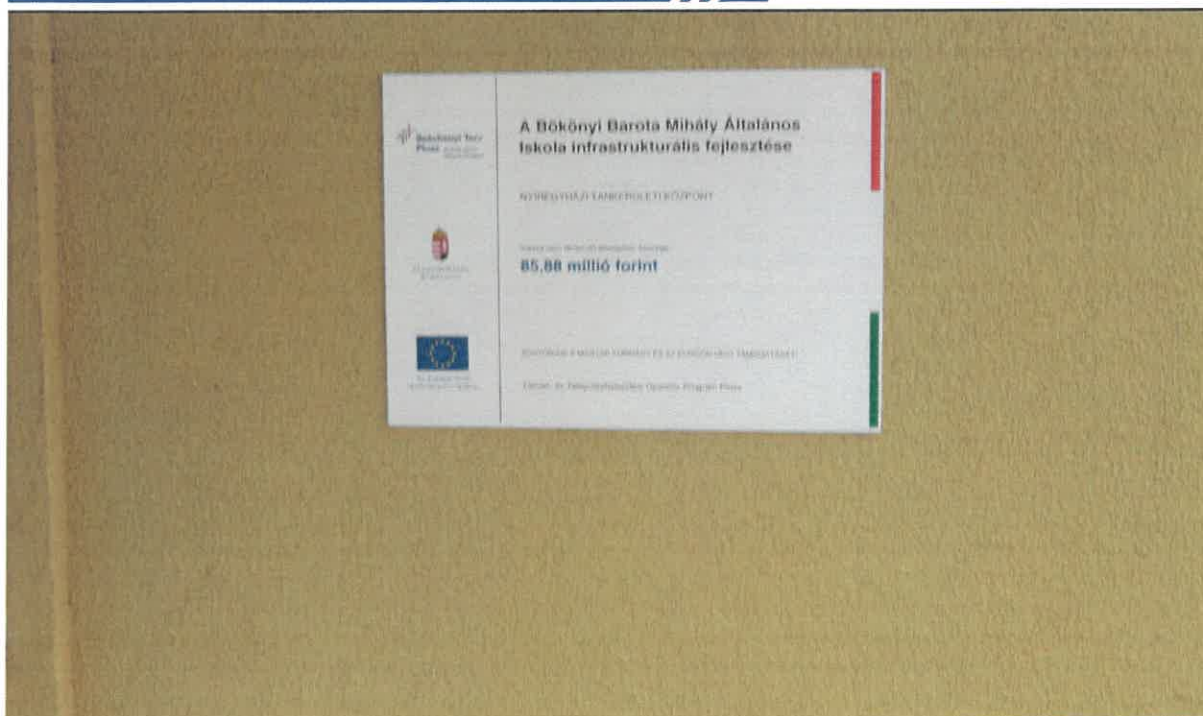

- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozza magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00018	T420P01128	3 630 510	82 245 174	85 875 684

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	6 507	3 695 494	6 812 750	-359 156	10 155 595

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	2024.05.06.	193,0000				
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	193
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	193

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	193
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	193
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	193
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	193
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	460	0	460
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	460

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	460
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	460
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	460
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	460
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1

Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.



.....

Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00019

A projekt címe: Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 91 340 285 Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; 4465 Rakamaz, Bocskai u. 55/A.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23- án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok:

Az intézmény tornatermének külső vakolata több helyen hiányzik, a nyílászárók nem záródnak, így nem szolgálja maradéktalanul a tanulók egészséges mozgásának fejlesztését. Szükségessé vált az épület hőszigetelése, valamint a külső nyílászárók cseréje, a tornatermi öltözők felújítása, eszközbeszerzés.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbeszerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

2026. 02. hó- IKT eszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 02. 04.; részek: 18.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződéskötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

Az IKT eszközök beszerzése 18 részes közbeszerzési eljárás szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés megtörtént.

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértére vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT


A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft alatti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése
<https://kk.gov.hu/az-erzsebet-kiralyne-nemet-nemzetisegi-altalanos-iskola-es-alapfoku-muveszeti-iskola-infrastrukturalis-fejlesztese-top-plusz-3-3-3-23-sb1-2024-00019>

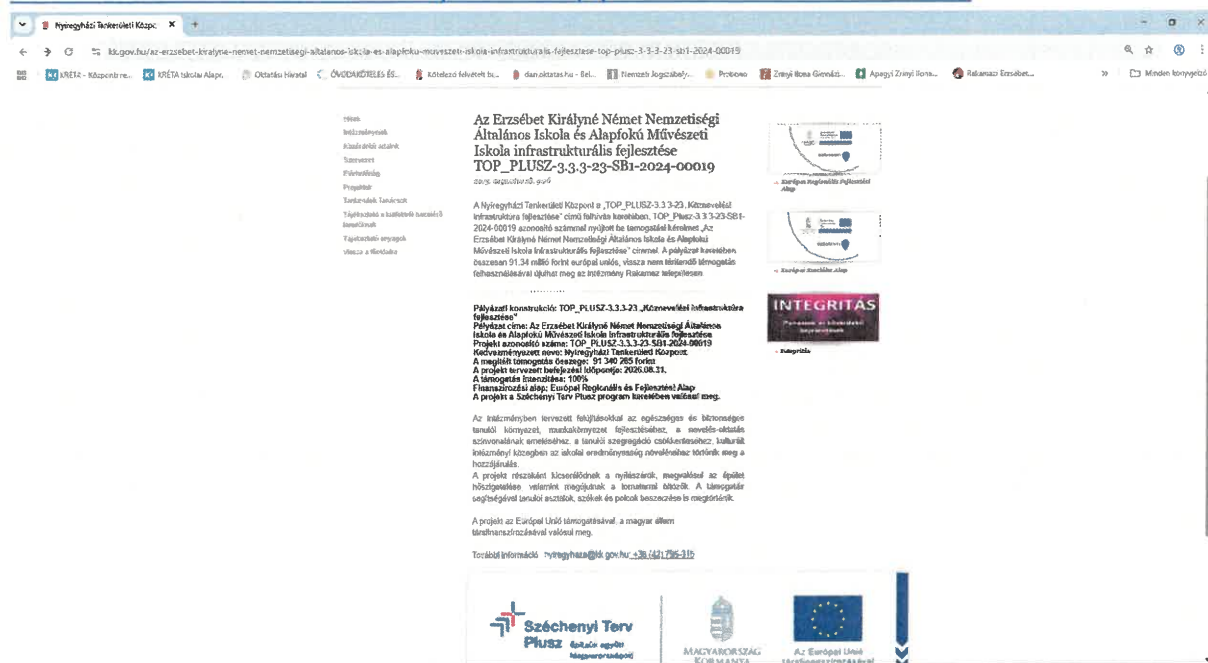

Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett intézmény honlapján 2025.08.28-án:

https://altisk-rakamaz.edu.hu/wp-content/uploads/2025/09/Sajtokozlomeny_TOP_Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00019.pdf



projekt megvalósítási szakaszában

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

A sajtónyilvános eseményünk előtt sajtóközleményt küldtünk ki a sajtó képviselőinek.



Tisztelet Szerkesztője!

Melékletben tisztelettel küldöm meghívónkat.

Ödvözléssel:



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató
Nyíregyházi Tankerületi Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. 4. emelet
Telefon: +36 42 795 315
E-mail: nyireghaza@tkk.gov.hu

- Sajtónyilvános esemény szervezése

2025. szeptember 24.

https://www.nyiregyhaza.hu/post/felujitasok-a-tankerületi-kozpontnal-ket-es-fel-milliard-forintbol-korszerusodnek-az-iskolak-2025-09-25?fbclid=IwY2xjawNC_51leHRuA2FibQlMQBicmlkETBpb2pQaEhDaFNhMmtoT1M1AR5D7-AzVdiwgfDVsuCGLK-U7Vh3eBZle-dWvW4yaGc8m9mEJ70aGLadbNIIQ_aem_jegBc0ibgdOSH91lgGy5W



Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka
Szept 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

– nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanárra, a tanítóra, a pedagógus egyéniségre fókuszál"

– nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése



- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozza magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00019	T420P01129	3 174 690	19 541 145	22 715 835

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	6 507	4 711 494	6 699 218	-353 695	11 063 524

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	2024.05.06.	3040000				
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	304
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	304
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	304
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	304
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	304

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	304
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	300	0	300
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	300
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	300
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	300
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	300

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	300
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély

			köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00020

A projekt címe: A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 49 163 654 Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Tiszaeszlári Általános Iskola; 4464 Tiszaeszlár, Hunyadi u. 4.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23-án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok:

Az intézmény tornatermének külső vakolata több helyen hiányzik, a nyílászárók nem záródnak, így nem szolgálja maradéktalanul a tanulók egészséges mozgásának fejlesztését. Szükségessé vált az épület hőszigetelése, valamint a külső nyílászárók cseréje, a tornatermi öltözők felújítása, eszközbeszerzés.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbeszerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződéskötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértére vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT

A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.


NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft alatti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése

<https://tiszaeszlari-iskola.webnode.hu/>

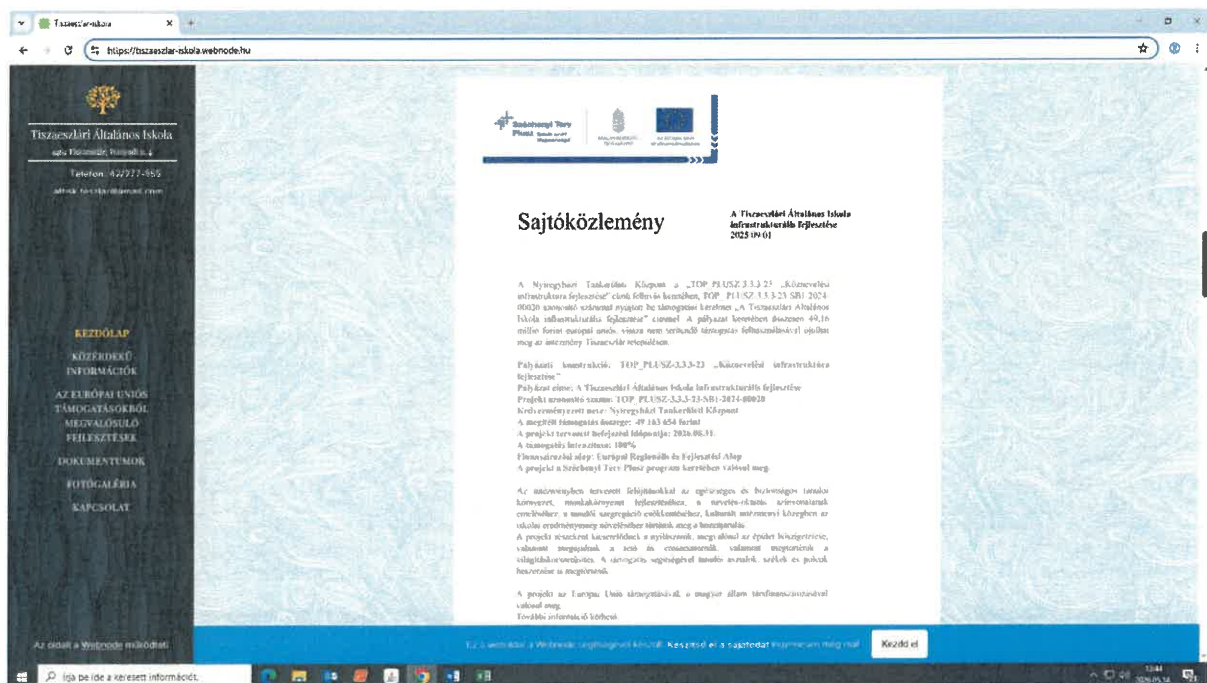

projekt megvalósítási szakaszában

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

A sajtónyilvános eseményünk előtt sajtóközleményt küldtünk ki a sajtó képviselőinek.

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

- nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanár, a tanító, a pedagógus egyéniségre fókuszál"

- nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése



xiaomi 15T
2026.05.12 08:54



23mm f/1.7 1/237s ISO50
48°2'29"N 21°27'13"E

- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozza magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a

tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00020	T420P01130	1 137 410	48 026 244	49 163 654

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	6 507	5 108 369			5 114 876

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves	Indikátor	2024.05.06.	202				

felhasználói (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	202
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	202
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	202
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	202
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	202
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves	Indikátor			2032.08.31.	0	0	202

felhasználói (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	220	0	220
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	220
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	220
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	220
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	220
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi	Indikátor			2032.08.31.	0	0	220

kapacitása (kevésbé fejlett régiók)							
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés

			lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mértékegységig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.



(Handwritten signature)

Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00021

A projekt címe: A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 44 670 725Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Kállay Miklós Általános Iskola; 4224 Kállósemjén, Kölcsey u. 2.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23-án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok:

A település egyetlen általános iskolájának külső homlokzati felújítása a korábbi években megtörtént, azonban a belső terek felújítása is szükségessé vált. Szeretnénk megvalósítani az épületben a közlekedő területek lambériájának cseréjét, a lambéria feletti területek festését, a tornaterem belső festését, a belső ajtók cseréjét, a nevelői szobában a linóleum cseréjét, a falak belső festését, belső ajtók cseréjét, tea konyha kerámia burkolását. Iskolai bútorok és IKT eszközök beszerzése.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbeszerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

2026. 02. hó- IKT eszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 02. 04.; részek: 18.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződéskötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

Az IKT eszközök beszerzése 18 részes közbeszerzési eljárás, valamint a sporteszközök beszerzése tárgyú 4 részes nyílt közbeszerzési eljárások jelenleg bírálati szakaszban vannak.

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértéρε vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT

A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft alatti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése

<https://kmai.hu/wp-content/uploads/2025/09/sajtokozlemeny.pdf>



projekt megvalósítási szakaszában

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

A sajtónyilvános eseményünk előtt sajtóközleményt küldtünk ki a sajtó képviselőinek.

Elérkezési idő: Kezdeti határidő: 2025. szeptember 12. Határidő: 2025. szeptember 12.

From: Nyíregyházi TNR [KK] <nyireghazi@tntk.gov.hu>
Sent: Friday, September 12, 2025 12:30 PM
To: balazs.siklosi@szekesfehervar.hu; info@szekesfehervar.hu; zoltan.balogh@gmail.com; janos.marton@szekesfehervar.hu; balazs.pogacs@gmail.com; borisak@nyireghaza.hu; zabosadrian@nyireghaza.hu; peter.siklosi@szekesfehervar.hu; monika.bednarek@szekesfehervar.hu; info@szekesfehervar.hu; info@szekesfehervar.hu; marcsa.sziget@szekesfehervar.hu; veronika@nyireghaza.hu; balazs.klont@nyireghaza.hu; zoltan@nyireghaza.hu; info@nyireghaza.hu
Cc: Pécsi Balázs Ágnes <agnes.balazs@ntk.gov.hu>
Subject: Nyíregyházi Tankörlet) KÖZÖLT TOP PLUSZ 3.3.3. MEGHÍVÓ sajtó részére

Tisztelt Szerkesztőség!

Mellékletben tárgyalattal küldöm megkísérletet

Üdvözléssel:



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

Nyíregyházi Tankerületi Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. 8. épület
Telefon: +36 42 795 315
E-mail: nyirevhuza@tkc.gov.hu

- Sajtónyilvános esemény szervezése

2025. szeptember 24.

https://www.nyiregyhaza.hu/post/felujitasok-a-tankeruleti-kozpontnal-ket-es-fel-milliard-forintbol-korszerusodnek-az-iskolak-2025-09-25?fbclid=IwY2xjawNC_51eHRuA2FlBQlxBQBicmlkETBpb2pQaEHdaFNhMmtoT1M1AR5zD7-AzVdiwgfDVsuCGLK-U7Vh3eBZle-dWwV4yaGc8m9mEJ70aGLadbNlIQ_aem_jegBc0ibgdOSH91ligGy5w



Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka
Szept 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

- nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa"

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanárra, a tanítóra, a pedagógus egyéniségre fókuszál"

- nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése



- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozzá magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00021	T420P01131	1 149 125	43 521 600	44 670 725

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	6 507	8 591 927	3 166 612	-331 852	11 433 194

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	2024.05.06.	181				

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	181
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	181
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	181
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	181
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	181
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	181

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	416	0	416
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	416
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	416
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	416
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	416
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	416

Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek

			teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.



B

Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00022

A projekt címe: A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 49 096 918 Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Tiszanagyfalui Általános Iskola; 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 62-64.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23-án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok:

Az intézmény működtetésére vonatkozó költségek megtakarítása szempontjából nagyon fontos a tornaterem épületének külső hőszigetelése, festése, valamint a külső nyílászárók cseréje és az eszközbeszerzés.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/ költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbeszerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

2026. 02. hó- IKT eszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 02. 04.; részek: 18.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződéskötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

Az IKT eszközök beszerzése 18 részes közbeszerzési eljárás, valamint a sporteszközök beszerzése tárgyú 4 részes nyílt közbeszerzési eljárások jelenleg bírálati szakaszban vannak.

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértére vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT

A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.


NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft alatti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése

<https://kk.gov.hu/a-tiszanagyfalui-altalános-iskola-infrastrukturális-fejlesztése-top-plusz-3-3-3-23-sb1-2024-00022>

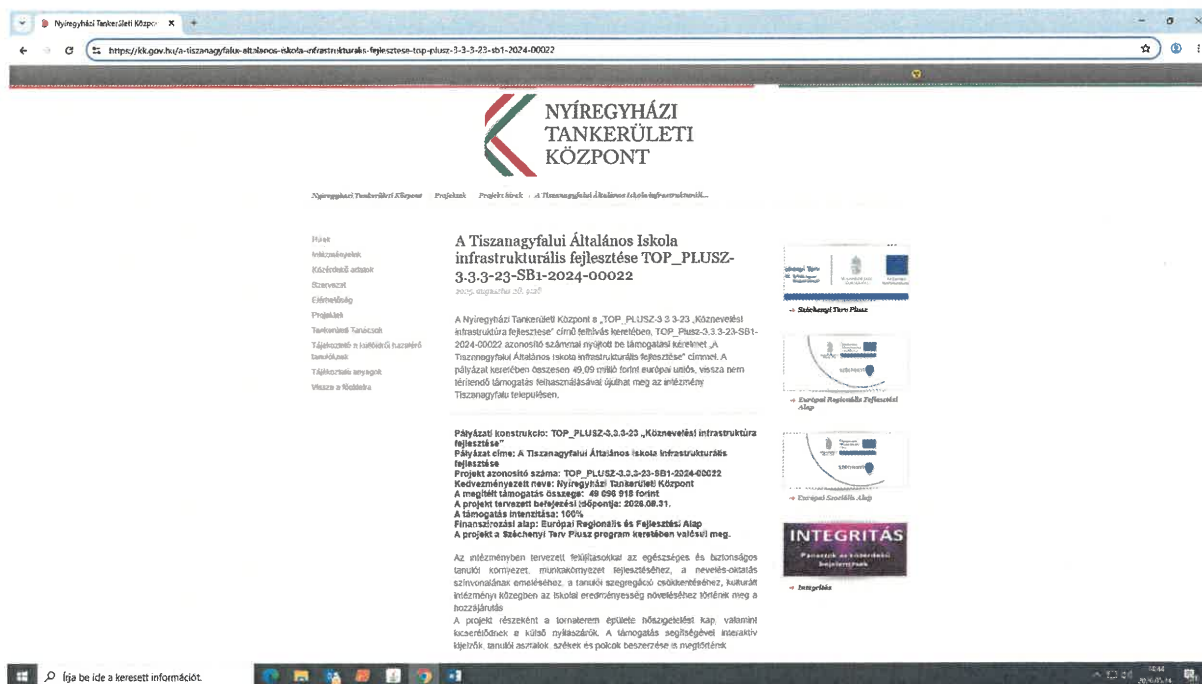

projekt megvalósítási szakaszában

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

A sajtónyilvános eseményünk előtt sajtóközleményt küldtünk ki a sajtó képviselőinek.

Előzetes: Készítés határideje: 2025. szeptember 12. Határidő: 2025. szeptember 12.

TDP PLUS2 3.3.3, meglehetően saját.docx.docx fáj	Békányi székfoglalás.docx.docx fáj	Tiszadob székfoglalás.docx.docx fáj	Békányi székfoglalás.docx.docx fáj	Tiszadob székfoglalás.docx.docx fáj
Buják székfoglalás.docx.docx fáj	Tiszadob székfoglalás.docx.docx fáj	Tiszadob Kálldányi Kálmán székfoglalás.docx.docx fáj	Tiszadob székfoglalás.docx.docx fáj	Békányi székfoglalás.docx.docx fáj
Tiszadob székfoglalás.docx.docx fáj	Kálldányi Kálmán székfoglalás.docx.docx fáj	Tiszadob székfoglalás.docx.docx fáj	Neményi székfoglalás.docx.docx fáj	Vághelyi Vághelyi Tiszadob székfoglalás.docx.docx fáj

[illegible]

Tisztelt Szerkesztőség!

Melékletben tisztelettel küldöm meghívónkat:

Üdvözléttel:



Pócsi Beáta Ágnes
tankerüzleti igazgató

Hydregyházi Tankerüzleti Központ
4400 Hydregyháza, Sóstói út 31/B. B. épület
Telefon: +36 42 795 315
E-mail: hydregyhaza@pik.gov.hu

- Sajtónyilvános esemény szervezése

2025. szeptember 24.

https://www.nyiregyhaza.hu/post/felujitasok-a-tankeruleti-kozpontnal-ket-es-fel-milliard-forintbol-korszerusodnek-az-iskolak-2025-09-25?fbclid=IwY2xjawNC_51leHRuA2FbQlxMQBicmlETBpb2pQaEhDaFNhMmtoT1M1AR5zD7-AzVdiwgfDVsuCGLK-U7Vh3eBZLe-dWwV4yaGc8m9mEJ70aGLadbNIIQ_aem_jegBc0ibgdOSH91ligGy5w



Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka
Szep 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

- nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanár, a tanító, a pedagógus egyéniségre fókuszál"

- nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése



- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozza magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00022	T420P01132	1 235 685	47 861 233	49 096 918

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	6 507	4 266 994	4 479 023	-337 311	8 415 213

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	2024.05.06.	203				
Az új vagy korszerűsített oktatási	Indikátor			2027.08.31.	0	0	203

létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	203
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	203
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	203
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	203
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	203
Az új vagy korszerűsített oktatási	Indikátor			2027.08.31.	305	0	305

létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	305
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	305
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	305
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	305
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	305
Korszerűsített köznevelési	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1

intézmények száma							
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.

Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)
----------------------	---	-------------	--

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00023

A projekt címe: A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 36 159 580 Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; 4483 Buj, Rákóczi u. 6.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23-án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok:

A település szívében lévő impozáns épületegyüttes a régi iskolaépület kibővítésével jött létre. A tantermek és az emeleti folyosó padlóburkolatának cseréje a tornaterem padlózatának cseréje, a hozzá tartozó öltözők rekonstrukciója, valamint az eszközbeszerzés indokolt.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/ költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbeszerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződéskötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

Az **IKT eszközök beszerzése** 18 részes közbeszerzési eljárás **szerződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés megtörtént.**

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértére vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT

A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.


NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft alatti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése

<https://kk.gov.hu/a-buji-ii-rakoczi-ferenc-altalános-iskola-es-alapfoku-muveszeti-iskola-infrastrukturális-fejlesztése-top-plusz-3-3-3-23-sb1-2024-00023>

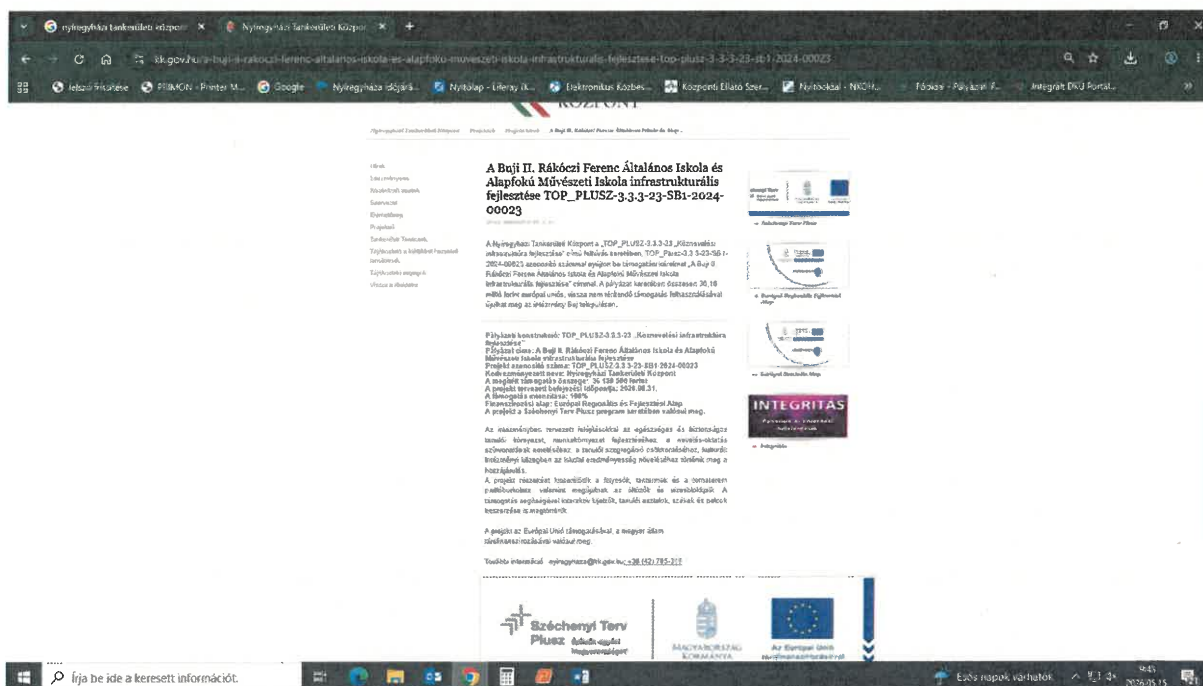

A projekt megvalósítási szakaszában

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

A sajtónyilvános eseményünk előtt sajtóközleményt küldtünk ki a sajtó képviselőinek.

Előzetes kiadás: 2025. szeptember 12. Határidő: 2025. szeptember 12.

 TOP PLU12 3.3.3. magistvé sajd.docx.docx doci faji	 Baftary sajtoademy.docx.docx doci faji	 Tizadad sajtoademy.docx.docx doci faji	 Sildary sajtoademy.docx.docx doci faji	 Tizadad sajtoademy.docx.docx doci faji
 Buq sajtoademy.docx.docx doci faji	 Tizadad sajtoademy.docx.docx doci faji	 Tizadad Kallaym: sajtoademy.docx.docx doci faji	 Tizadad sajtoademy.docx.docx doci faji	 Beryn 4 sajtoademy.docx.docx doci faji
 Tizadad sajtoademy.docx.docx doci faji	 Kallaym sajtoademy.docx.docx doci faji	 Tizadad sajtoademy.docx.docx doci faji	 Nydyr sajtoademy.docx.docx doci faji	 Oshidat Waple Tizadad sajtoademy.docx.docx doci faji

[illegible]

Tisztelt Szerkesztőség!

Mellékletben tisztelettel küldöm meghívónkat.

Für den Fall:



Pócsi Beáta Ágnes
tankerüzleti igazgató

Hydregyházi Tankerüzleti Kárpont
4400 Hydregyháza, Söntei út 31/A. 8. épület
Telefon: +36 42 795 315
E-mail: myregyhaza@tk.gov.hu

- Sajtónyilvános esemény szervezése

2025. szeptember 24.

https://www.nyiregyhaza.hu/post/felujitasok-a-tankeruleti-kozpontnal-ket-es-fel-milliard-forintbol-korszerusodnek-az-iskolak-2025-09-25?fbclid=IwY2xjawNC_51leHRuA2FlbQ1xMQBicmlkETBpb2pQaEhDaFNhMmtoT1M1AR5zD7-AzVdiwgfDVsuCGLK-U7Vh3eBZle-dWvW4yaGc8m9mEJ70aGLadbNIIQ_aem_jegBc0ibgdOSH91IlgGy5w



Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka
Szep 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

– nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanárra, a tanítóra, a pedagógus egyéniségre fókuszál"

– nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése



- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozza magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00023	T420P01133	1 284 000	34 875 580	36 159 580

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	6 507	12 117 213			12 123 720

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0

Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	2024.05.06.	175				
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	175
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	175
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	175
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	175
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves	Indikátor			2031.08.31.	0	0	175

felhasználói (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	175
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	220	0	220
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	220
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	220
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	220
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi	Indikátor			2031.08.31.	0	0	220

kapacitása (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	220
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása,

			akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.





Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00024

A projekt címe: A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 63 636 748 Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola;
4456 Tiszadob, Mátyás király u. 7.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23- án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok:

Az intézmény emeleti vizesblokkjának korszerűsítése, a felújításból eddig kimaradt tantermek, közlekedők felújítása, klimatizálás illetve akadálymentesítés indokolt.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/ költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbekészítés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szereződéskötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértékre vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT


A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft alatti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése
- <https://kk.gov.hu/a-tizadobi-szechenyi-istvan-altalános-iskola-es-alapfoku-muveszeti-iskola-infrastrukturális-fejlesztése-top-plusz-3-3-3-23-sb1-2024-00024>

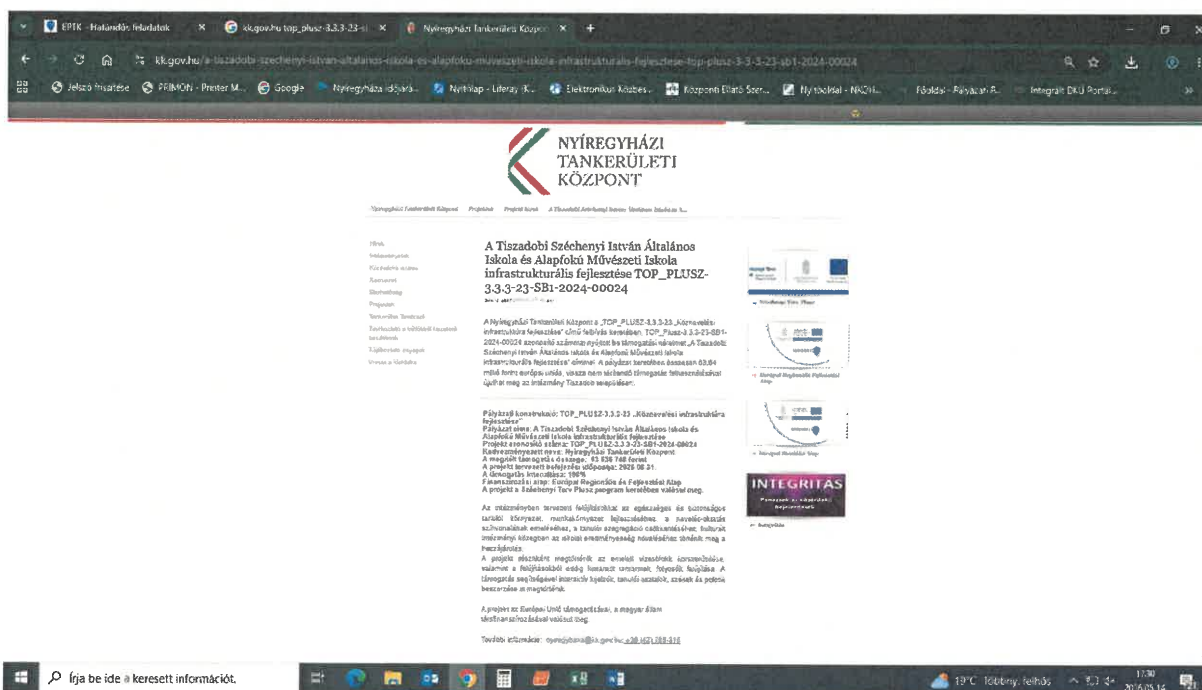

projekt megvalósítási szakaszában

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

A sajtónyilvános eseményünk előtt sajtóközleményt küldtünk ki a sajtó képviselőinek.

Előnyös időpont: 2025. szeptember 12. Határidő: 2025. szeptember 12.

 TOP PLUSZ 3.3. meghívó sajtó.docx.docx fáj	 Békési sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Tiszabéri sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Békési sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Tiszabéri sajtóközlemény.docx.docx fáj
 Buj sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Tiszacseri sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Erdőbéri Kórház Békési sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Tiszaközi sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Békési sajtóközlemény.docx.docx fáj
 Tiszacseri sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Kállos Mihályról sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Tiszacseri sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Norium sajtóközlemény.docx.docx fáj	 (Kérlek! Nevelő Tanács sajtóközlemény.docx.docx fáj)

Melléklethez risztelelletel küldöm meghívónkat

Üdvözléssel:



Hydregyházi Tankerületi Központ
4400 Hydregyháza, Sóstói út 31/B. 8. épület
Telefon: +36 42 795 315
E-mail: szerezhaza@ik.gov.hu

- Sajtónyilvános esemény szervezése

2025. szeptember 24.

https://www.nyiregyhaza.hu/post/felujitasok-a-tankeruleti-kozpontnal-ket-es-fel-milliard-forintbol-korszerusodnek-az-iskolak-2025-09-25?fbclid=IwY2xjawNC_51leHRuA2FlbQlXMQBicmlKETBpb2pQaEhDaFNhMmtoT1M1AR5zD7-AzVdiwgfDVsuCGLK-U7Vh3eBZle-dWwV4yaGc8m9mEJ70aGLadbNlIQ_aem_jegBc0ibgdOSH91lgGy5w



Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka
Szept 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

– nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanárra, a tanítóra, a pedagógus egyéniségre fókuszál"

– nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése



- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozzá magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00024	T420P01134	2 140 000	61 496 748	63 636 748

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	6 507	4 774 994	4 425 683	-337 311	8 869 873

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	2024.05.06.	187				
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	187
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	187
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	187
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	187
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	187

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	187
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	352	0	352
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	352
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	352
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	352
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	352

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	352
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély

			köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.



(Handwritten signature)

Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

(Handwritten initials and marks)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00025

A projekt címe: A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 27 680 900 Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola; 4487 Tiszatelek, Kossuth u. 36, Kossuth u. 38.

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23-án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az intézményekben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az intézményben tervezett felújítási munkálatok:

Az intézmény tornatermének tetőhéjazata felújításra szorul, a tornaterem vizesblokkjainak felújítás, valamint ezen kívül fedett faszerkezetű előtető készítése, a tanári- és igazgatói iroda padlózatának cseréje indokolt.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbeszerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szereződéskötésre csupán 4 rész esetében** kerülhetett sor. **A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

Az **IKT eszközök beszerzése** 18 részes közbeszerzési eljárás **szereződéskötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés megtörtént.**

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértére vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT

A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft alatti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése

<https://kk.gov.hu/a-tiszateleki-hunyadi-matyas-altalanos-iskola-infrastrukturális-fejlesztése-top-plusz-3-3-3-23-sb1-2024-00025>

**NYÍREGYHÁZI
TANKERÜLETI
KÖZPONT**

Nyíregyházi Városi Tanács Projekt Projekt leírás A Tiszateleki Hunyadi Mátyas Általános Iskola honlapján

A Tiszateleki Hunyadi Mátyas Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025
idő: 2024.08.01. 10:00:00

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében, TOP_Plus-3.3.3-23-SB1-2024-00025 azonosító számmal nyújtott be támogatási kérelmet. A Tiszateleki Hunyadi Mátyas Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” címmel. A pályázat keretében összesen 27,05 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával építhet meg az intézmény Tiszatelek településen.

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése”
Pályázat címe: A Tiszateleki Hunyadi Mátyas Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025
Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
A megítélt támogatás összege: 27 050 000 forint
A projekt tervezett befejezési időpontja: 2026.08.31.
A támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Az intézményben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanuló környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelési-oktatási színterének emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturális intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez történik meg a hozzájárulás.

A projekt részeként megújul a tornaterem beépítése épül egy fedett, fűszelvezető asztalos, valamint megújulnak az üvegház és vízműellátó rendszerrel. A támogatás segítségével innovatív kiegészítő, tanuló asztalok, székek és padok beszerzése is megvalósul.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

További információ: nyiregyhaza@kk.gov.hu; +36 (42) 798-318

 **Széchenyi Terv
Plusz** Építsük együtt
Magyarországot!


MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA


Az Európai Unió
társfinanszírozásával

projekt megvalósítási szakaszában

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

A sajtónyilvános eseményünk előtt sajtóközleményt küldtünk ki a sajtó képviselőinek.

FW: Nyíregyházi Tankerületi Központ_ TOP PLUSZ 3.3.3. MEGHÍVÓ sajtó részére

Értékelés: Készítés határideje: 2025. szeptember 12. Határidő: 2025. szeptember 12.

 TDP PLINIE 3.3.3. magistrie sašlo.docx.docx (1)	 Baňdny sašlo.docx.docx (1)	 Tisadob sašlo.docx.docx (1)	 Baňdny sašlo.docx.docx (1)	 Tisadob sašlo.docx.docx (1)
Byg sašlo.docx.docx (1)	Tisadob sašlo.docx.docx (1)	Tisadob sašlo.docx.docx (1)	Tisadob sašlo.docx.docx (1)	Tisadob sašlo.docx.docx (1)
 Tisadob sašlo.docx.docx (1)	 Tisadob sašlo.docx.docx (1)	 Tisadob sašlo.docx.docx (1)	 Tisadob sašlo.docx.docx (1)	 Tisadob sašlo.docx.docx (1)

From: Nyíregyházi TTK (KK) <nyiregyhaza@kt.gov.hu>

Sent: Friday, September 12, 2025 12:30 PM

To: hirado@myrscvha.hus; kriszta@myrscvha.hus; nadja@myrscvha.hus; info@myrscvha.hus; zoltan@myrscvha.hus; tamas@myrscvha.hus; nora.bogoczka77@gmail.com; honlap@myrscvha.hus; stabo.sabolcska@myrscvha.hus; peter.stoksz@kajet.hu; monika.besznar@kajet.hu; kajet@kajet.hu; kido@med4work.hu; info@sunshinefm.hu; marianna.sigos@sunshinefm.hu; yaron@mtc.hu; bela@psa-mtc.hu; saito@bestimmymyrscvha.hus; myrscvha@radio1.hu

Cc: Pécsi Beáta Ágnes <agnes.besta.peci@tkc.gov.hu>
Subject: Nyiregyházi Tankerületi Központ TOP PLUSZ 3.3.3. MEGHÍVÓ sajtó részére

Tisztelt Szerkesztőség!

Mellékletben tisztelettel küldöm meghívónkat

Üdvözléttel;



Pécsi Beáta Ágnes
tanterületi igazgató

Nyíregyházi Tankerületi Központ
4406 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. 8. épület
Telefon: +36 42 795 315
E-mail: nyiregyhaza@tkp.zy.hu

- Sajtónyilvános esemény szervezése

2025. szeptember 24.

https://www.nyiregyhaza.hu/post/felujitasok-a-tankeruleti-kozpontnal-ket-es-fel-milliard-forintbol-korszerusodnek-az-iskolak-2025-09-25?fbclid=IwY2xjawNC_51leHRuA2FibQlxMQBicmlKEtBpb2pQaEhDaFNhMmtoT1M1AR5zD7-AzVdiwgfDVsuCGLK-U7Vh3eBZLe-dWwV4yaGc8m9mEJ70aGLadbNIIQ_aem_jegBc0ibgdOSH91IlgGy5w



Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka
Szept 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

– nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanárra, a tanítóra, a pedagógus egyéniségre fókuszál"

– nyilatkozta a képviselő.


A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése



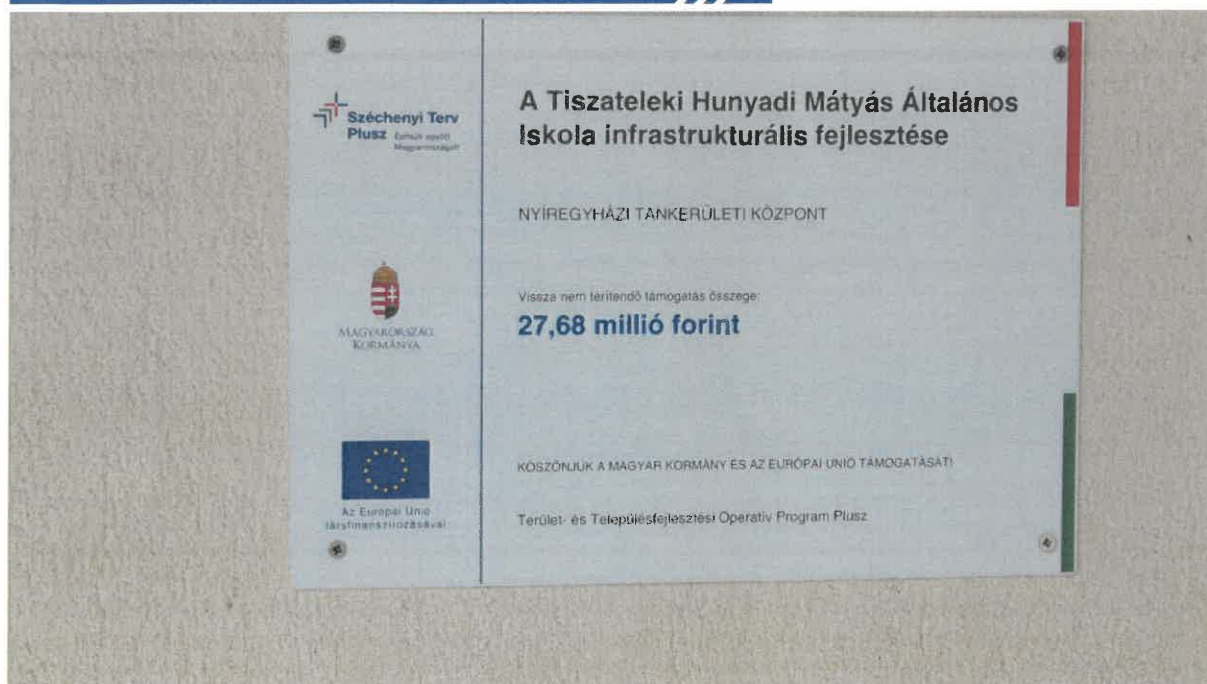

- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozza magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00025	T420P01135	1 412 400	26 268 500	27 680 900

Kiadások:	2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
	6 507	6 552 994	3 166 612	-331 852	9 394 261

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	2024.05.06.	209				
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	209
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	209

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	209
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	209
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	209
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	209
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	225	0	225
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	225

Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	225
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	225
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2031.08.31.	0	0	225
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	225
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	1	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	1	1

Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor		2031.08.31.	0	1	1
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor		2032.08.31.	0	1	1

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026, szeptember 3.



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projektazonosító: TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00026

A projekt címe: Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 328 987 168 Ft

Finanszírozási forma: Uniós támogatás

Megvalósítási helyszín: Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; 4484 Ibrány, Ady u. 56.

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Tiszaberceli Bessenyei György Tagintézménye; 4474 Tiszabercel, Fő u. 19,

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Paszabi Turi Sándor Tagintézménye; 4475 Paszab, Fő út 1.

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sényői Tagintézménye; 4533 Sényő, Kossuth u. 20/c

A projekt szakmai előrehaladása, fizikai állása:

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 17 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 16 pályázat támogató döntése érkezett meg 2025. júliusában. A Támogatási szerződések mindkét fél általi aláírására 2025. július 23- án került sor.

A pályázat keretében összesen 2,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg 19 intézményünk a vármegyében.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt célja az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét elősegítő színvonalas, korszerű infrastruktúra megteremtése, melynek során a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, illetve az intézmények különös figyelmet szentelnek a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok speciális fejlesztésére, a velük való foglalkozás infrastrukturális hátterének biztosítására is, úgy, hogy minél fiatalabb korban elérhetővé váljon a diákok számára.

A projekt hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni célok teljesítéséhez is, hiszen a tervezett infrastrukturális fejlesztések megteremtik a keretet és az alapvető tárgyi-, technikai-, eszköz- és infrastrukturális feltételeket az iskolában. Ezzel egyidejűleg a projektben megvalósítandó fejlesztések a gyermekek, diákok hátránykompenzációját is elősegítik.

Az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet hozzájárul a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, akadálymentesítéssel a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez. Az egészséges, esztétikus és kulturált tanulói környezet a pedagógusok és az intézmény közvetett partnerei, a szülők részéről is évek óta igényként merül fel. Az intézmény ibrányi telephelyén az uszoda külső homlokzatának felújítása, a Tiszaberceli Bessenyei György Tagintézményben az udvari futó- és kézilabdapálya rekonstrukciója, a Paszabi Turi Sándor Tagintézményben homlokzati hőszigetelés, színezés, illetve a Sényői Tagintézményben az udvari betonpálya felújítása, a tanári szoba korszerűsítése, továbbá a telephelyeken akadálymentesítés indokolt.

A MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

A projekt 2025. szeptember elsejével indult. Az elmúlt idő alatt eredményes beszerzési eljárások eredményeként kiválasztottuk az állami közbeszerzési szaktanácsadónkat, valamint a tervezőket/költségellenőröket, megjelentek az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési felhívásaink

A közbeszerzési felhívásokat Uniós, nyílt eljárásrend szerint írtuk ki.

2025. 12. hó- bútorbeszerzés: Ajánlati felhívás: 2025. 12. 17., részek: 16.

2026. 02. hó- IKT eszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 02. 04.; részek: 18.

2026. 02. hó- sporteszközök beszerzése: Ajánlati felhívás: 2026. 01. 21.; részek: 4.

Az eszközbeszerzések tárgyú nyílt közbeszerzési eljárások ex-ante ellenőrzés mellett kerülnek lebonyolításra, egyrészt a Magyar Államkincstár szakmai ellenőrzése, valamint a Nemzeti Fejlesztési Központ közbeszerzési-elszámolhatósági minőségellenőrzése, illetve szabályossági ellenőrzése mellett.

A **bútorok beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárásban az írásbeli összegezés kiküldésére az EKR rendszerben 2026.03.20. napján került sor, melyben jelenleg előzetes vitarendezési eljárás van folyamatban, így a Nemzeti Fejlesztési Központ támogató tartalmú záró tanúsítványa ellenére a nyertes ajánlattevővel a támogatott projekteket érintően **szerződészkötésre csupán 4 rész esetében kerülhetett sor. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.**

Az **IKT eszközök beszerzése** 18 részes közbeszerzési eljárás **szerződészkötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés megtörtént.**

A **sporteszközök beszerzése** 4 részes közbeszerzési eljárásban a szerződészkötések megtörténtek. Szabályossági jegyzőkönyvek megérkeztek. Teljesítés folyamatban.

A tervezők/ költségellenőrök felmérték a megvalósítási helyszínt, majd elkezdődhetett a szakági tervezőkkel egyeztetve a tervezési folyamat, a szükséges engedélyeztetési folyamatok felmérése, lefolytatása, épületenergetikai vizsgálat lefolytatása, fotódokumentáció készítése, akadálymentesítési hiányosságok feltárása, tervfejezet készítése.

A szükséges éghajlati rezilienciavizsgálat dokumentumai elkészültek. A biológiai aktivitásértére vonatkozó számítások folyamatban vannak, várhatóan 2026. október végére készülnek el a dokumentumok.

PROJEKTMENEDZSMENT

A pályázat megvalósításán 1 fő projekt menedzser és 1 fő pénzügyi vezető dolgozik, célfeladat kiírás keretében, havi 16 órában.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

180 millió Ft feletti projekt- KTK-PLUSZ

A projekt előkészítési szakaszában

- Kommunikációs terv készült a pályázat benyújtásakor.
- nyomtatott vagy elektronikus tájékoztató készítése

Kelet- Magyarország napilap 2025.08.28.

Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében, TOP_Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00026 azonosító számmal nyújtott be támogatási kérelmet „Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastruktúrális fejlesztése” címmel. A pályázat keretében összesen 328,99 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újulhat meg az intézmény és tagintézményei Ibrány, Tiszabercel, Paszab és Sényő településeken.

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése”

Pályázat címe: Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastruktúrális fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026

Kedvezményezett neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ

A megítélt támogatás összege: 328 987 168 forint

A projekt tervezett befejezési időpontja: 2027. 08. 31.

A támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Az intézményben tervezett felújításokkal az egészséges és biztonságos tanulói környezet, munkakörnyezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturált intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez történik meg a hozzájárulás.

A projekt részeként Ibrányban az iskolai uszoda lambéria burkolata megújul, illetve megtörténik az uszodai hőcserélő korszerűsítése. Tiszabercelen az udvari futó- és kézilabdapálya rekonstrukciója valósul meg. Paszabon a főépület hőszigetelést, a tornaterem új vakolatot kap, valamint kialakításra kerül egy sportudvar is. Sényőn az udvari betonpálya felújítása és a tanári szoba korszerűsítése valósul meg. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek és polcok beszerzése is megtörténik.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

További információ: nyiregyhaza@kk.gov.hu; +36 (42) 795-315

- A Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése
- <https://kk.gov.hu/az-ibranyi-arpad-fejedelem-altalanos-iskola-es-alapfoku-muveszeti-iskola-es-tagintezmenyeinek-infrastrukturalis-fejlesztese-top-plusz-3-3-3-23-sb1-2024-00026>

NYÍREGYHÁZI TANKERÜLETI KÖZPONT

Nagygyűházi Tankerületi Központ Projekt felhívás Projekt híreiről Az Ibrányi Árpád Fejedelemséget Széchenyi Terv Plusz Programja

Projekt
Információk
Küldetés, célkitűzés
Szervezet
Előzetes
Projekt
Információk
Információk
Információk a Széchenyi Terv Plusz Programról
Információk
Információk a Széchenyi Terv Plusz Programról
Információk

Az Ibrányi Árpád Fejedelemséget Széchenyi Terv Plusz Programja és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026

2024. május 14. 10:00

A Nagygyűházi Tankerületi Központ a „TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében, TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026 azonosító számmal nyújtott be támogatási kérelmet „Az Ibrányi Árpád Fejedelemséget Széchenyi Terv Plusz Programja és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése” címmel. A pályázat keretében összesen 328,90 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával újul meg az intézmény és tagintézményei Ibrány, Tiszabercel, Pászab és Sényő településeken.

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése”
Pályázat címe: Az Ibrányi Árpád Fejedelemséget Széchenyi Terv Plusz Programja és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026
Kedvezményezett neve: Nagygyűházi Tankerületi Központ
A megítélt támogatás összege: 328 907 168 forint
A projekt tervezett befejezési időpontja: 2027.09.30.
A támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozási alap: Európai Regionális és Fejlesztési Alap
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Az intézményben tervezett felújítások az egészséges és biztonságos tanulási környezet, munkakörülmények fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, kulturális intézményi közegben az iskolai eredményesség növeléséhez történik meg a hozzájárulás.

A projekt részeként Ibrányban az iskolai uszoda lambéria burkolata megújul, illetve megújul az uszoda hőcserélő korszerűsítése. Tiszabercelen az udvari hűtő- és káziabudapálya rekonstrukciója valósul meg. Pászabon a tépőelő hőszigetelést, a tornaterem új vállalkozó kap, valamint kialakításra kerül egy sportudvar is. Sényőn az udvari öltözőhelyiség felújítására, és a tornai szoba korszerűsítésére valósul meg. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek és polcok beszerzése is megvalósul.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

További információ: nyiregyhazi@kt.gov.hu, +36 (42) 796-315



Európai Regionális Fejlesztési Alap



Európai Unió Alap



Integritás



A projekt megvalósítási szakaszában

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról

A sajtónyilvános eseményünk előtt sajtóközleményt küldtünk ki a sajtó képviselőinek.

 P 2025.09.11. 10:36
Mikita Eszter
FW: Nyíregyházi Tanterületi Központ_TOP PLUSZ 3.3.3. MEGHÍVÓ sajtó részére
Ünnelet Göncz Sándor
📌

TDP PUK2 3.3.3. meghívó sajtó.docx.docx fáj	Békési András sajtóközlemény.docx.docx fáj	Tiszadobi sajtóközlemény.docx.docx fáj	Békési sajtóközlemény.docx.docx fáj	Tiszadobi sajtóközlemény.docx.docx fáj
Békési sajtóközlemény.docx.docx fáj	Tiszadobi sajtóközlemény.docx.docx fáj	Tiszabert Károlyról Károkai sajtóközlemény.docx.docx fáj	Tiszabert sajtóközlemény.docx.docx fáj	Békési 4 sajtóközlemény.docx.docx fáj
 Tiszabert sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Károly Károlyról sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Tiszabert sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Nyitra sajtóközlemény.docx.docx fáj	 Új értesítéssel sajtóközlemény.docx.docx fáj

[illegible]

Tisztelt Szerkesztőség!

Mellékletben tisztelettel küldöm meghívónkat.

Üdvözléssel:



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató

Vyřegyházi Tankerületi Központ
4430 Vyřegyháza, Szentó út 31/B. 3. épület
Telefon: +36 42 795 315
E-mail: moregabeta@kt.gov.hu

- Sajtónyilvános esemény szervezése

2025. szeptember 24.

https://www.nyiregyhaza.hu/post/felujitasok-a-tankeruleti-kozpontonl-ket-es-fel-milliard-forintbol-korszerusodnek-az-isolak-2025-09-25?fbclid=IwY2xjawNC_51leHRuA2FibQxMQBicmlKETBpb2pQaEhDaFNhMmtoT1M1AR5zD7-AzVdiwgDFVsUGLK-U7Vh3eBZle-dWwV4yaGc8m9mEJ70aGLadbNlIQ_aem_jegBc0ibgdOSH91ligGy5w



Felújítások a tankerületi központnál – Két és fél milliárd forintból korszerűsödnek az iskolák

Nagy Boglárka
Szept 25, 2025

Két és fél milliárd forintos felújítási munkálatok kezdődnek a Nyíregyházi Tankerületi Központnál. Vissza nem térítendő, európai uniós forrásból 19 településen 19 intézmény korszerűsödhet. A támogatás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

Sajtónyilvános nyitórendezvényen számoltak be a Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeit érintő közelgő beruházásokról a napokban. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében több pályázatot is benyújtott a tankerületi központ, végül összesen 2 és fél milliárd forint forrást nyert a különböző felújításokra.

Felújítások 19 település 19 helyszínén

Többek között a balkányi, bökönyi, tiszadobi, tiszadadaí és újfehértói iskolák beruházásaira nyertek vissza nem térítendő, európai uniós forrást, de összességében 19 település 19 intézményét érintik a fejlesztések. A tankerület iskoláit folyamatosan ellenőrzik, vizsgálják, több felmérés is megelőzte a hamarosan induló beruházásokat.

Nagyon sok pályázati lehetőséget használunk ki, illetve kapunk is, akár hazai, akár uniós forrásokból, így nagyon jók az ellátottságok. Az RRF pályázatnak köszönhetően például minden tanulónak osztottunk ki laptopokat, notebookokat, az iskoláink pedig jól felszereltek okostáblákkal és okostantermekkel, robotika-tantermekkel. A digitális kultúrát teljesen magas színvonalon tudják oktatni a pedagógusok"

– nyilatkozta a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Pécsi Beáta Ágnes.

A most elnyert forrás segítségével interaktív megjelenítő eszközök, tanulói asztalok, székek, sporteszközök gazdagíthatják az intézmények eszközállományát.

„A ma oktatása, a holnap Magyarországa”

Az oktatás egy komplex egység, amelynek fontos része a megfelelő infrastruktúra is – erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt, a politikus körzetében több intézmény is érintett a hamarosan induló felújítási programban.

Ez a nagy volumenű pályázat javítja az oktatási feltételrendszert, akár a mindennapos testnevelést, a szaktantermek kialakítását az interaktív eszközök segítségével. Azt szoktuk mondani, hogy amilyen a ma oktatása, olyan lesz a holnap Magyarországa. Ennek érdekében az elmúlt időszakban a tanári béremelés megtörtént, a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata – mint szakbizottsági tag tudom mondani – megtörtént, tehát sokszínű, sokirányú az oktatás és egyre inkább a tanárra, a tanítóra, a pedagógus egyéniségre fókuszál"


– nyilatkozta a képviselő.

A tervezett felújítások hozzájárulnak majd az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez, a nevelés-oktatás színvonalának emeléséhez, a tanulói szegregáció csökkentéséhez, valamint a kulturált intézményi közegben megvalósuló iskolai eredményesség növeléséhez is.

<https://www.facebook.com/reel/1322176492824873>

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1180300803911941&set=pcb.1180303930578295>

- A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla kihelyezése

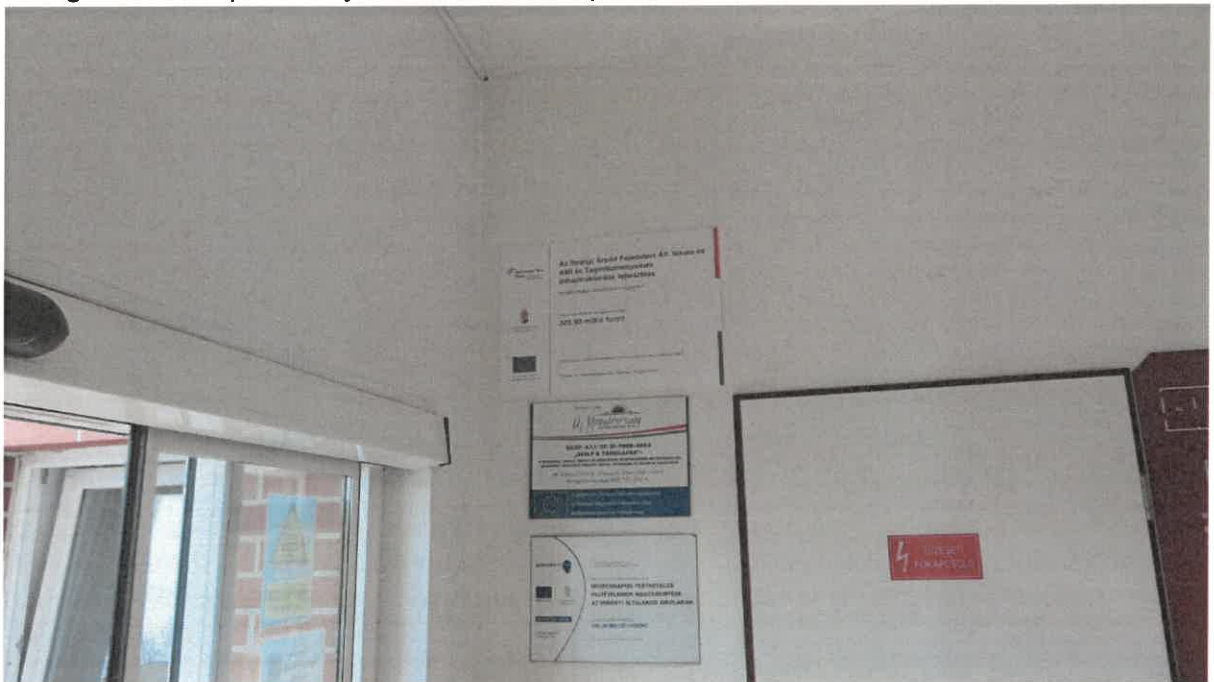

Ibrányi Árpád Fejedeleme Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola



Ibrányi Árpád Fejedeleme Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Paszabi Turi Sándor Tagintézmény



Ibrányi Árpád Fejedeleme Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sényői Tagintézménye



Ibrányi Árpád Fejedeleme Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszaberceli Bessenyei György Tagintézmény

- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A felmérési fotódokumentáció elkészült.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa működtetett iskolák tanulói modern, 21. századi körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Ebben segít ez a projekt is. Az intézményi felújítások az egészséges és biztonságos tanulói környezet fejlesztéséhez járulnak hozzá, amely hozza magával a nevelés-oktatás színvonalának emelését, a tanulói szegregáció csökkentését. A kulturált intézményi közeg az iskolai eredményesség növeléséhez is sokat tesz hozzá, ezért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak.

A pénzügyi teljesítés állása:

Lehívott előleg:

	Pénzügyi központ	2025	2026	Összesen
TOP-Plusz-3.3.3-23-SB1-2024-00026	T420P01136	9 575 500	55 785 068	65 360 568

Kiadások:

2025	2026	IMG számlák	IMG-ből nem elszámolható	Összesen
581 830	37 260 697	23 264 266	-1 392 935	59 713 858

Indikátorok bemutatása, célértékek/ tényértékek ismertetése:

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2027.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2028.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2029.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2030.08.31.	0	0	0
Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2031.08.31.	0	0	0

Korszerűsített kollégiumok száma	Indikátor			2032.08.31.	0	0	0
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor	2024.05.06.	664,0000				
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	0	0	664
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	664
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	664
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	664
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves	Indikátor			2031.08.31.	0	0	664

felhasználói (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	664
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2027.08.31.	1 480	0	1 480
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2028.08.31.	0	0	1 480
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2029.08.31.	0	0	1 480
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2030.08.31.	0	0	1 480
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi	Indikátor			2031.08.31.	0	0	1 480

kapacitása (kevésbé fejlett régiók)							
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Indikátor			2032.08.31.	0	0	1 480
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2027.08.31.	4	4	4
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2028.08.31.	0	4	4
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2029.08.31.	0	4	4
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2030.08.31.	0	4	4
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2031.08.31.	0	4	4
Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Indikátor			2032.08.31.	0	4	4

Megvalósítás ütemezése:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítés	1	2026. 11. 20.	Teljes műszaki dokumentáció összeállítása az összes érintett tevékenységre vonatkozóan, tervezői nyilatkozatok, az előírt szakmai,- műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása,

			akadálymentesítésről szóló tervfejezet, tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, nem építési engedély köteles tevékenységről, energiahatékonysági szempontok érvényesüléséről, kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány, nyilatkozat új épület/ épületrész esetén, a fejlesztés lehatárolása- amennyiben releváns, Tulajdonviszonyok rendezése- amennyiben releváns, Tulajdoni lap Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. számú melléklet nyilatkozata szerint.
Projekt megvalósítás	2	2027.08.31.	nyilatkozat projektmenedzsment szervezetről, kapcsolódó ESZA+/RRF fejlesztés megvalósulásának igazolása, az előírt szakmai,-műszaki,- horizontális feltételek érvényesülésének bemutatása, informatikai szakember és rehab. környezettervező szakmérnök nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről, nyilatkozat akadálymentesítésről (amennyiben releváns), kötelező nyilvánosság, projektzárását igazoló dokumentumok (pl. műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv...)

A projekt megvalósítását érintő lényeges változások: nem releváns.

A megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett/ tervezett intézkedések ismertetése: nem releváns.

A projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények: nem releváns.

A projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja:

Tervezett fizikai befejezés: 2027.08.31.

Tervezett pénzügyi befejezés: 2027.10.30.

Egyéb információ: nem releváns.

Nyíregyháza, 2026. szeptember 3.



Pécsi Beáta Ágnes
tankerületi igazgató



Mátészalkai Tankerületi Központ

**Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Önkormányzati Hivatal**

Nyíregyháza
Hősök tere 5.
4400

Tárgy: Tájékoztatás TOP_Plusz-33.3.-23 projektekről

Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatom, hogy a Mátészalkai Tankerületi Központ a lent felsorolt TOP_PLUSZ-3.3.3-23 kódszámú „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázatokban érintett.

s.sz.	Projekt megnevezése	Projekt címe	Támogatási összeg
1	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00001 azonosítószámú Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	4355 Nagyecsed Rózsas utca 1.	294.000.000
2	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00002 azonosítószámú Jármí-Papos-Ör Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	4337 Jármí Petőfi Sándor utca 18.	295.000.000
3	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00003 azonosítószámú Nyírkátai Általános Iskola felújítása	4333 Nyírkáta Hodászi u. 1-3. é	377.000.000
4	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00004 azonosítószámú Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	4700 Mátészalka Kölcsey tér 1.	61.000.000
5	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00005 azonosítószámú Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése-2. ütem	4361 Nyírbogát Hunyadi út 1.	159.000.000
6	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00006 azonosítószámú Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	4946 Tiszakóród Kossuth út 42.	63.500.000
7	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00007 azonosítószámú a Szatmárcsekesi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	4945 Szatmárcseke Kölcsey utca 11.	179.500.000

Székhely: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 10.

Telefon: +36-44-795-218

E-mail: mateszalka@kk.gov.hu

8	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00008 azonosítószámú Dr. Jósai István Általános Iskola felújítása Kislétán	4325 Kisléta Kállói út 6- 8.	114.000.000
9	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00009 azonosítószámú a A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	4900 Fehérgyarmat, Május 14 tér. 33	407.000.000

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00001 azonosítószámú Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00003 azonosítószámú Nyírkátai Általános Iskola felújítása, TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00004 azonosítószámú Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése és a TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00005 azonosítószámú Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése-2. ütem projektek esetében a megvalósítási folyamatok megkezdődtek, a tervezési szakasz folyamatban van.

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00007 azonosítószámú a Szatmárcsekesi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése projekt esetében a napokban újabb helyszíni bejárásra kerül sor a megvalósíthatóság érdekében.

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00009 azonosítószámú A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése projekt esetében a helyszíni bejárást követően szakember által megállapításra került, hogy statikai vizsgálatra lesz szükség, mely a következő hetekben valósul meg. Ennek függvényében folytatódik a projekt megvalósítása.

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00002 azonosítószámú Jármű-Papostető Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00006 azonosítószámú Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB-2024-00008 azonosítószámú Dr. Jósai István Általános Iskola felújítása Kislétán projektek vonatkozásában a Támogatási Szerződésben vállalt tevékenységek megvalósításától a Mátészalkai Tankerületi Központ eláll, azaz a projektet a Támogatási Szerződés keretei között nem kívánja megvalósítani.

Mátészalka, 2026. szeptember 14.

Tisztelettel:


Vilmosné Horváth Ildikó
szakmai vezető, tankerületi igazgató h.



Székhely: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 10.

Telefon: +36-44-795-218

E-mail: mateszalka@kk.gov.hu

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS

.../2026. (IX.23.)

önkormányzati határozata

TOP_Plusz-3.3.3-23 kódszámú „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhíváshoz kapcsolódó kiemelt eljárásrendű projektek előrehaladásáról

A Vármegyei Közgyűlés

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Integrált Területi Program keretében megvalósuló, TOP_Plusz-3.3.3-23 kódszámú „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhíváshoz kapcsolódó kiemelt eljárásrendű projektek előrehaladásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.

A határozatot kapja:

Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén

Nyíregyháza, 2026. szeptember 23.
